

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2018

Corte Septiembre 2018

Contenido





- 1. Avance MEGA ●
- 2. Ejecución Plan de Acción
 - ❖ Ejecución Indicadores ●
 - ❖ Ejecución Indicadores Estratégicos ●
 - ❖ Ejecución Actividades ●
- 3. Solicitudes / Modificaciones Plan de Acción ●
- 4. Anexo 1: Informe de Cumplimiento de actividades detallado ●





Ejecución Acumulada MEGA 2018

Ejecución MEGA 2015-2017

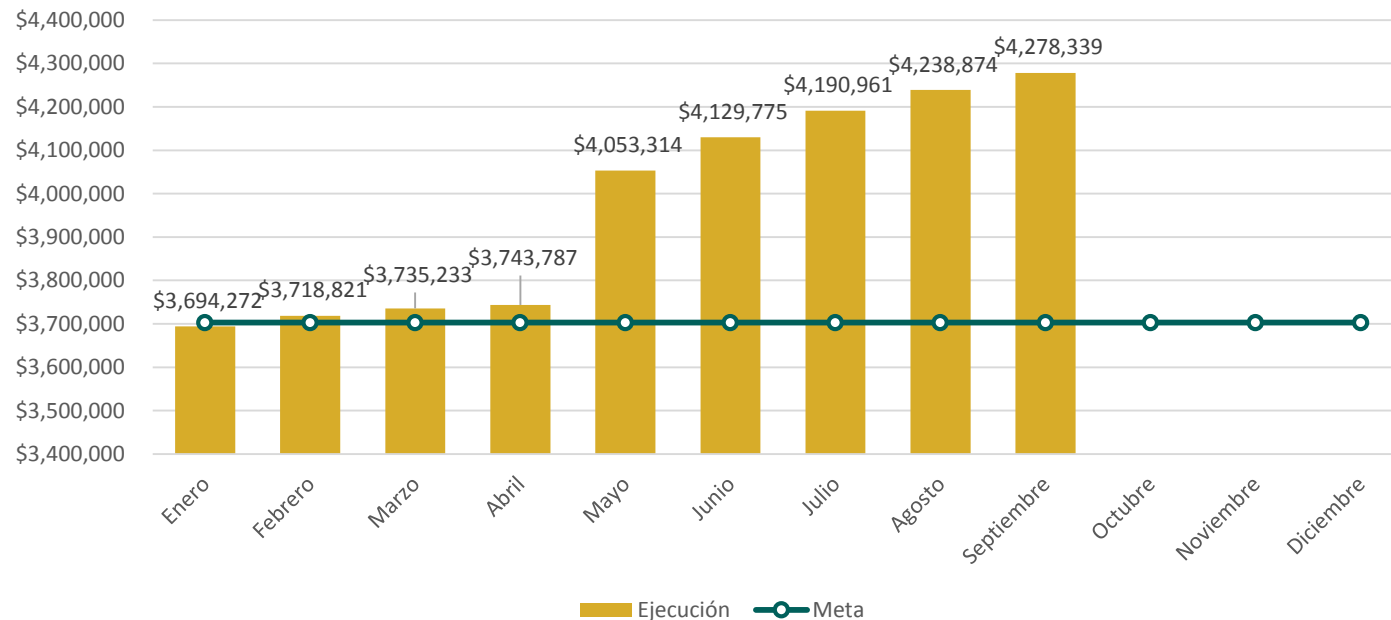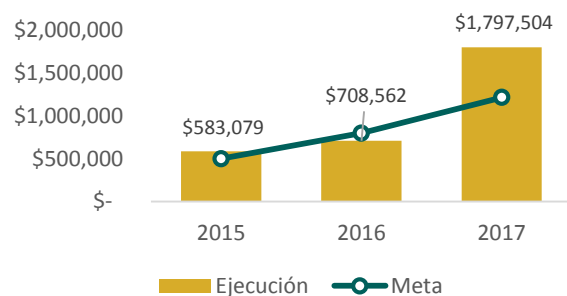

Análisis:

A Septiembre de 2018, se ha realizado adquisiciones de cartera por \$355.674, administración de cartera por \$21.787, compra de inmuebles por \$3.700 y comercialización de inmuebles por \$808.033 Destacándose entidades como Ministerio de Agricultura - FINAGRO, ISVIMED, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, SAE, Fondo Nacional de Garantías, Superpuertos.




Ejecución Indicadores Financieros




Líneas de Negocio Tradicionales


Compra de Inmuebles

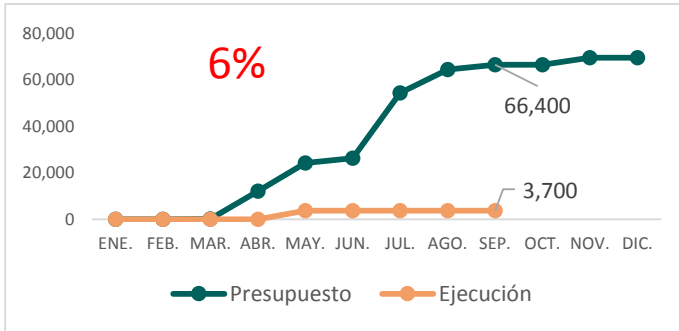


Promesas

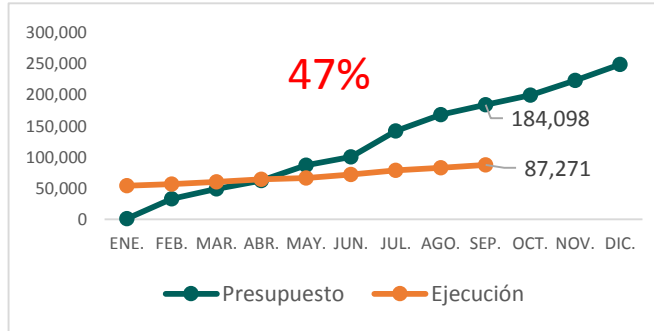


Compra de Cartera

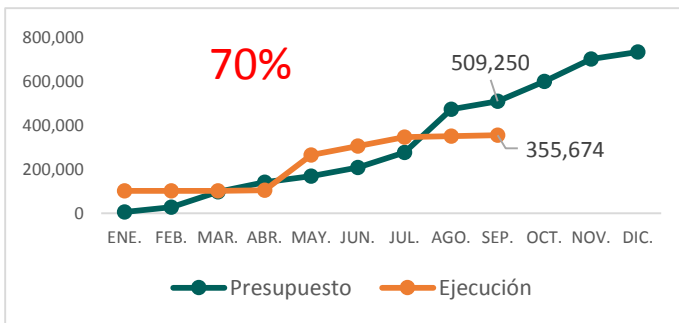

Escrituras

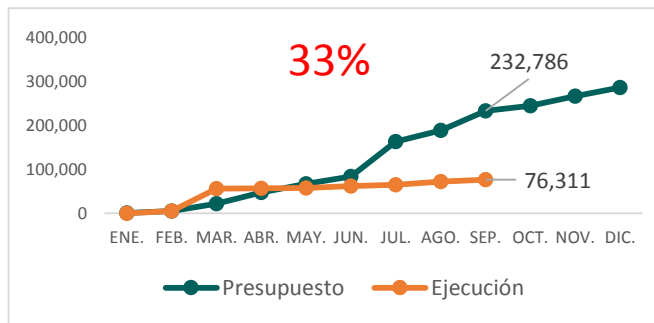

Recaudo de Cartera

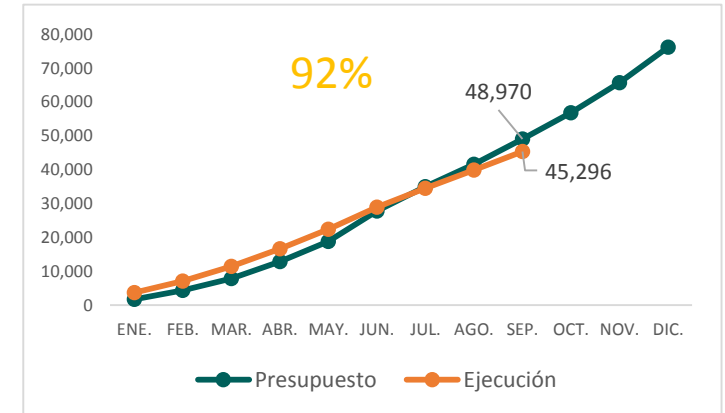


Ejecución Indicadores Financieros




Líneas de Negocio No Tradicionales


Administración de Inmuebles

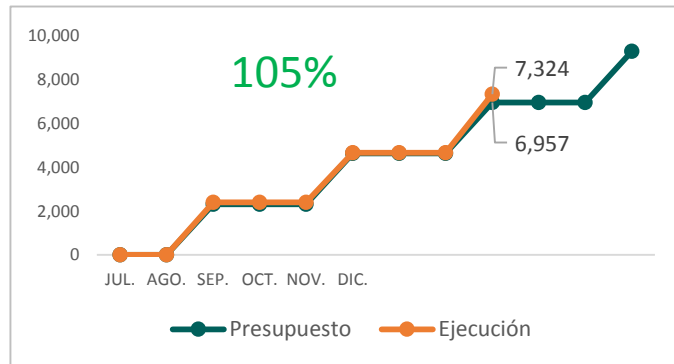


Contratos Comercialización

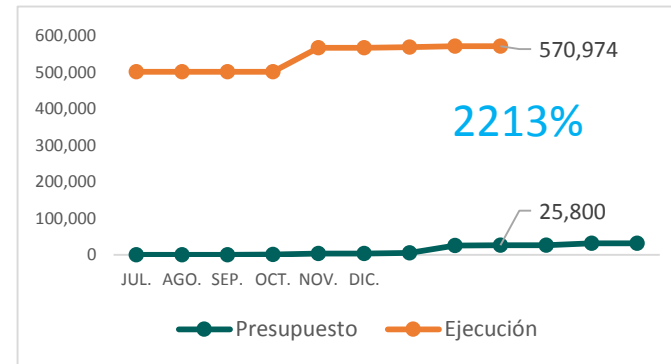

Administración de Cartera

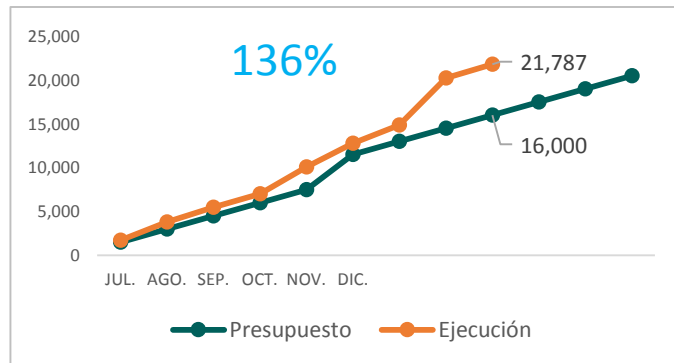

Contratos Comercialización SAE

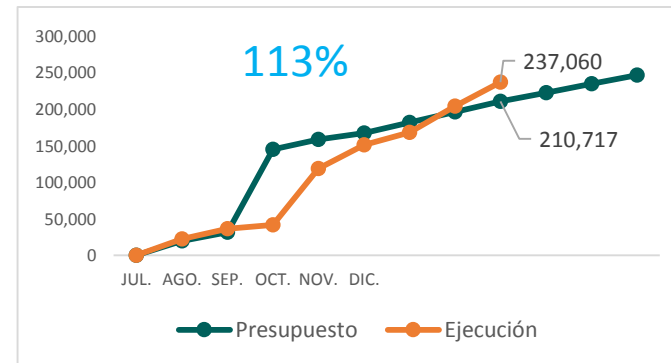


Ejecución Indicadores Financieros




Líneas de Negocio No Tradicionales


Gestión de Inmuebles (Fonvivienda)

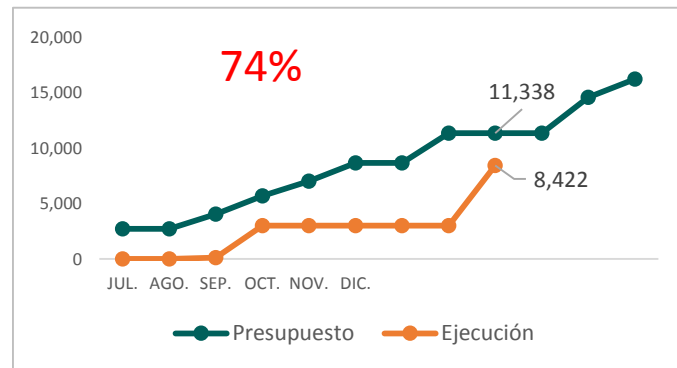


Subasta Electrónica

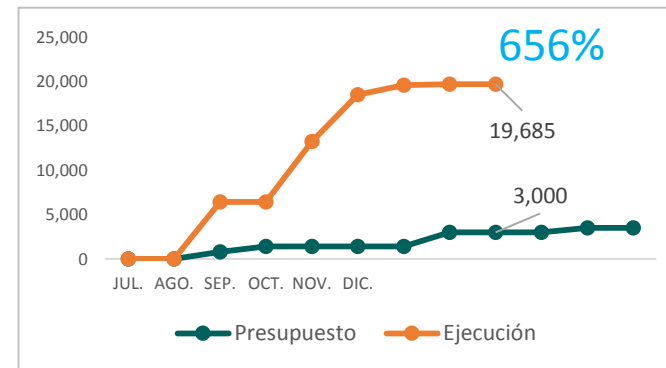

Levantamiento de Información

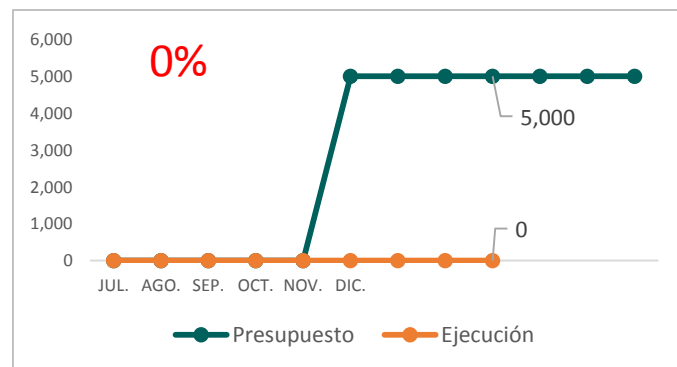

Software Estado

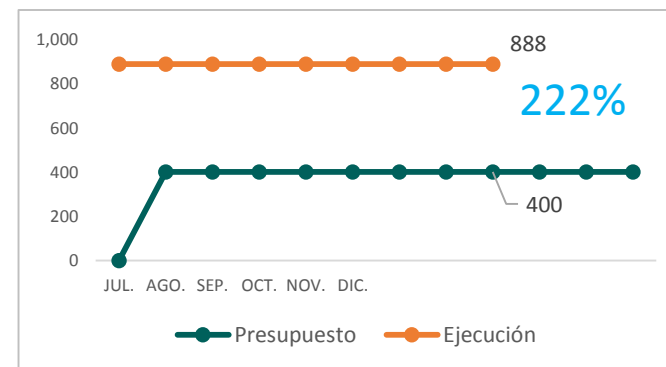

Ejecución Indicadores Estratégicos




Proyecto	Indicador	Meta Trimestre 2	% Cumplimiento	Estado
Pro.2018.NC1.001 Diseño y propuesta del marco normativo para la ley de gestión de activos públicos	Generación Proyecto de Ley de Gestión de Activos públicos aprobada ante las instancias internas de CISA	0	N.A	
Pro.2018.NC1.002 Diseño y propuesta del marco normativo para el Plan Nacional de Desarrollo	Generación Proyecto articulado para el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022	0	N.A	
Pro.2018.NC1.003 Posicionamiento de CISA - Sistema Integrado de Información	Implementación de ferias inmobiliarias	0	N.A	
Pro.2018.NC2.001 Dinamizar nuevas líneas de Negocio	% de Cumplimiento de Presupuesto acumulado para líneas de negocio no tradicionales	95%	126%	
Pro.2018.NC2.002 Optimización del modelo de costos de la fábrica de software CISA	Porcentaje de implementación del Modelo de Costos Fábrica de Software	80%	100%	
Pro.2018.NP1.001 Revisión, análisis y ajuste del modelo de negocio de CISA	Documentos generados	0	N.A	
Pro.2018.NP1.002 Consolidación de Cartera Coactiva	% de Cumplimiento de Presupuesto acumulado de Cartera Coactiva a adquirir	95%	82%	
Pro.2018.NP1.003 Fortalecimiento de las líneas de negocio tradicionales	% de Cumplimiento de adquisición acumulada de inmuebles y cartera	95%	132%	
Pro.2018.NP1.004 Optimización Movilización de Inmuebles	% de cumplimiento de Presupuesto de ventas acumulado de inmuebles	95%	74%	
Pro.2018.NP1.005 Optimización del recaudo de cartera	% de Cartera recaudada acumulada	95%	104%	
Pro.2018.NP2.001 Optimizar el esquema de saneamiento de inmuebles	# de Inmuebles Saneados	11	100%	
Pro.2018.NA1.001 Diseñar el Modelo de Gestión del Talento Humano para CISA	% de mejora en la calificación de gestión del desempeño organizacional	0	N.A	
Pro.2018.NA1.002 Fortalecer el liderazgo basado en la confianza	% de mejora en la percepción de líderes	0	N.A	

Excelente
 Bien
 Regular
 Mal



Ejecución Acumulada Planes de Acción

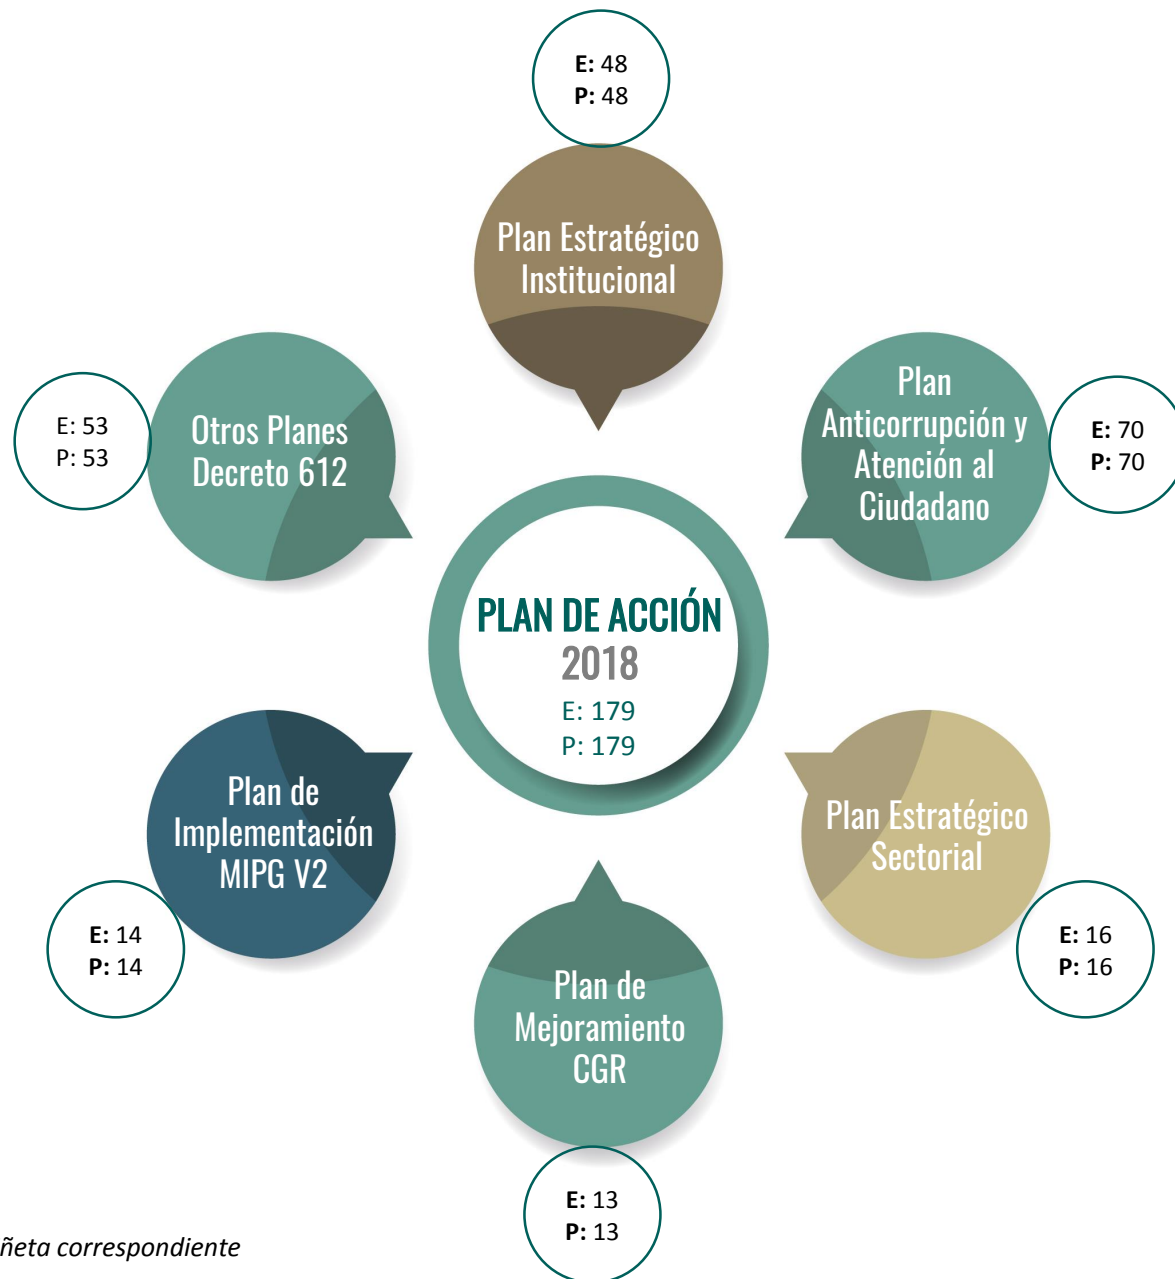

E: Actividades Ejecutadas
P: Actividades Programadas

* Para detalle de cada proyecto haga Clic en la viñeta correspondiente



Modificaciones Plan de Acción



Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2018, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Optimizar el esquema de saneamiento de inmuebles	Actividad	Modificar el responsable y fecha de la actividad "Proponer ajustes normativos externos que permitan la optimización de tiempos de saneamiento" Anterior Responsable: Vicepresidente Jurídica Anterior Fecha: 31/07/2018 Nuevo Responsable: Vicepresidente Saneamiento Nueva Fecha: 31/10/2018	19/02/2018	V2 19 de Febrero de 2018
Optimizar el esquema de saneamiento de inmuebles	Indicador	Modificar las metas intermedias del indicador del proyecto: Anterior: 1T: 1 2T: 12 3T: 29 4T: 7 Nuevo 1T: 3 2T: 11 3T: 20 4T: 15	19/02/2018	V2 19 de Febrero de 2018



Modificaciones Plan de Acción



Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2018, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Posicionamiento CISA - Sistema Integrado de Información	Otros	Se crea el proyecto y se incorpora al plan de acción 2018	19/02/2018	V2 19 de Febrero de 2018
Plan de Mejoramiento de la Contraloría - H13Jun14	Actividad	Modificar la cantidad de actividades asociado a la actividad "Optimización de la gestión de cobranza" Anterior: 19 Nuevo: 9	19/02/2018	V2 19 de Febrero de 2018
Pro.2018.NP1.004 Optimización Movilización de Inmuebles	Actividad	Modificar la fecha de la actividad "Ajuste política de precios de venta" así: Anterior Fecha: 15/03/2018 Nueva Fecha: 30/04/2018	05/03/2018	V3 25 de Abril de 2018
OA.2018.AS Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Plan Estratégico Sectorial	Actividad	Modificar la fecha de la actividad "Programa de Gestión Electrónica de documentos" Anterior Fecha: 31/03/2018 Nueva Fecha: 30/09/2018	12/03/2018	V3 25 de Abril de 2018



Modificaciones Plan de Acción



Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2018, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
OA.2018.SIU Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Actividad	Modificar las fechas de finalización para las actividades de "Informar a las áreas oportunidades de mejora. Bimestre x" En total se modifican 6 actividades pasando su finalización del primer día del mes al último día del mes	05/03/2018	V3 23 de Abril de 2018
Pro.2018.NC2.001 Dinamizar nuevas líneas de Negocio	Actividad	Modificar la fecha de finalización de las actividades: Realizar un estudio de mercado para el servicio de Software Estado y Realizar un estudio de mercado para el servicio de Enajenación de Participaciones Accionarias, Así: Anterior Fecha Software: 01/04/2018 Nueva Fecha Software: 31/05/2018 Anterior Fecha Participaciones: 15/05/2018 Nueva Fecha Participaciones: 06/04/2018	25/03/2018	V3 25 de Abril de 2018
OA.SIU.2018 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Actividad	Reabrir y modificar la descripción de la actividad: Revisar y optimizar el informe de PQRS así: Anterior: Revisar y optimizar el informe de solicitudes de acceso a la información con el fin de buscar que la información se presente de la manera más clara y concreta posible. Propuesto: Revisar y optimizar el informe de PQRS con el fin de buscar que la información se presente de la manera más completa posible.	25/04/2018	V3 25 de Abril de 2018



Modificaciones Plan de Acción



Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2018, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
OA.SIU.2018 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Actividad	<p>Crear una nueva actividad para en el marco del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano así:</p> <p>Actividad: revisar y optimizar el Informe de solicitudes de acceso</p> <p>Entregable: Informe Optimizado</p> <p>Fecha de Inicio: 01/04/2018 Fecha Final: 30/06/2018</p>	25/04/2018	V3 25 de Abril de 2018
Plan de Mejoramiento de la Contraloría - CGR - H15Feb14	Actividad	<p>Modificar el producto a entregar para los cortes del 30 de abril 2018 y 30 de enero 2019</p> <p>Fecha Actual: 30/04/2018 Actividad Anterior: Elaborar manuales técnico y de usuario para la aplicación CONCISA Actividad Propuesta: Elaborar manuales técnico y de usuario para la aplicación COBRA</p> <p>Fecha Actual: 30/01/2019 Actividad Anterior: Elaborar manuales técnico y de usuario para las aplicaciones COBRA, TEMIS e IMC Actividad Propuesta: Elaborar manuales técnico y de usuario para las aplicaciones CONCISA, TEMIS e IMC</p>	25/04/2018	V3 25 de Abril de 2018



Modificaciones Plan de Acción



Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2018, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
OA.SIU.2018 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Actividad	Modificar las fechas de las actividades: Actividad: Publicar informe de solicitudes Trimestre 1 Anterior Fecha: 01/04/2018 Nueva Fecha: 30/04/2018 Actividad: Publicar informe de solicitudes Trimestre 2 Anterior Fecha: 01/07/2018 Nueva Fecha: 31/07/2018 Actividad: Publicar informe de solicitudes Trimestre 3 Anterior Fecha: 01/10/2018 Nueva Fecha: 31/10/2018 Actividad: Publicar informe de solicitudes Trimestre 4 Anterior Fecha: 01/01/2019 Nueva Fecha: 31/01/2019	25/04/2018	V3 25 de Abril de 2018



Modificaciones Plan de Acción



Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2018, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
OA.SIU.2018 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Actividad	Modificar las fechas de las actividades: Actividad: Informar la gestión al CIGD. Trimestre 1 Anterior Fecha: 01/04/2018 Nueva Fecha: 30/04/2018 Actividad: Informar la gestión al CIGD. Trimestre 2 Anterior Fecha: 01/07/2018 Nueva Fecha: 31/07/2018 Actividad: Informar la gestión al CIGD. Trimestre 3 Anterior Fecha: 01/10/2018 Nueva Fecha: 31/10/2018 Actividad: Informar la gestión al CIGD. Trimestre 4 Anterior Fecha: 01/01/2019 Nueva Fecha: 31/01/2019	25/04/2018	V3 25 de Abril de 2018



Modificaciones Plan de Acción



Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2018, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Pro.2018.NP1.005 Optimización del recaudo de cartera	Actividad	Modificar la fecha de finalización de la actividad "Proveer servicios básicos necesarios para la gestión de cartera de coactiva" así: Anterior Fecha: 30 abril 2018 Nueva Fecha: 15 Julio 2018	25/04/2018	V3 25 de Abril de 2018
Pro.2018.NC1.003 Posicionamiento de CISA - Sistema Integrado de Información	Actividad	Modificar la fecha de finalización de la actividad "Implementar Intranet" así: Anterior Fecha: 30 abril 2018 Nueva Fecha: 15 Junio 2018	25/04/2018	V3 25 de Abril de 2018
Pro.2018.NC1.003 Posicionamiento de CISA - Sistema Integrado de Información	Actividad	Modificar el entregable de la actividad "Estructurar proyecto página web/ identificación de etapas y definición de alcance" así: Entregable Anterior: Contrato Nuevo Entregable: Elaboración del proyecto de términos de referencia.	25/04/2018	V3 25 de Abril de 2018
OA.2018.GL Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Actividad	Modificar la fecha de finalización de la actividad "Formular Política DDHH" así: Anterior Fecha: 30 abril 2018 Nueva Fecha: 29 Junio 2018	25/04/2018	V3 25 de Abril de 2018



Modificaciones Plan de Acción



Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2018, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
OA.2018.AI Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Actividad	<p>Modificar el entregable de la actividad "Verificar la elaboración, visibilización y publicación del PAAC":</p> <p>Anterior Entregable: Informe de Seguimiento Ley de Transparencia Nuevo Entregable: Informe de verificación a la publicación del PAAC</p>	21/05/2018	V4 28 de Mayo de 2018
OA.2018.AI Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Actividad	<p>Modificar la actividad:</p> <p>Actividad Anterior: "Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción para el cuatrimestre" Actividad Propuesta: Realizar seguimiento al PAAC conforme a la normatividad legal vigente</p> <p>Lo anterior para cada una de las 3 actividades propuestas a lo largo del año</p>	21/05/2018	V4 28 de Mayo de 2018
Pro.2018.NP1.004 Optimización Movilización de Inmuebles	Actividad	<p>Modificar la fecha de finalización de la actividad "Ajustar política de precios de venta" así:</p> <p>Anterior Fecha: 30 abril 2018 Nueva Fecha: 30 Agosto 2018</p>	21/05/2018	V4 28 de Mayo de 2018



Modificaciones Plan de Acción



Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2018, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Pro.2018.NP1.004 Optimización Movilización de Inmuebles	Actividad	Modificar la fecha de finalización de la actividad "Efectuar alianzas con entidades financieras" así: Anterior Fecha: 30 abril 2018 Nueva Fecha: 30 Julio 2018	21/05/2018	V4 28 de Mayo de 2018
Pro.2018.NC2.001 Dinamizar nuevas líneas de Negocio	Actividad	Crear una nueva actividad denominada "Reestructurar el servicio de venta de bienes muebles Fase 2" así: Anterior Fecha: 01 junio 2018 Nueva Fecha: 30 Agosto 2018 Entregable: Servicio reestructurado con base en el diagnostico	21/05/2018	V4 28 de Mayo de 2018
OA.2018.AS Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Actividad	Modificar la fecha de finalización de la actividad "Actualizar las Tablas de Retención Documental" así: Anterior Fecha: 04 Junio 2018 Nueva Fecha: 05 Octubre 2018	21/05/2018	V4 28 de Mayo de 2018



Modificaciones Plan de Acción



Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2018, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
OA.2018.AS Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Actividad	Modificar la fecha de finalización de la actividad "Elaborar las Tablas de Valoración Documental" así: Anterior Fecha: 31 Diciembre 2018 Nueva Fecha: 15 Enero 2018	21/05/2018	V4 28 de Mayo de 2018
OA.2018.AS Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Actividad	Modificar el nombre de la actividad: Anterior Nombre: Actualizar, presentar y publicar el registro o inventario de activos de información Nuevo Nombre: Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de información	21/05/2018	V4 28 de Mayo de 2018



Modificaciones Plan de Acción



Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2018, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Pro.2018.NC1.002 Diseño y propuesta del marco normativo para el Plan Nacional de Desarrollo	Actividad	<p>Modificar la fecha de finalización de la actividad "Analizar respuestas del MHCP - PND" así:</p> <p>Anterior Fecha: 29 Jun 2018 Nueva Fecha: 30 Septiembre 2018.</p>	21/06/2018	V5 21 de Junio de 2018
Pro.2018.NC2.001 Dinamizar nuevas líneas de Negocio	Actividad	<p>Modificar la actividad "Estructurar servicio de vitrina permanente para la venta de bienes muebles." Así.</p> <p>Entregable Anterior: Servicio en operación. Entregable Nuevo: Servicio Estructurado</p> <p>Crear una nueva actividad denominada Estructurar servicio de vitrina permanente para la venta de bienes muebles Fase 2</p> <p>Fecha Inicial: 01/07/2018 Fecha Final: 31/10/2018 Entregable: Servicio en operación.</p>	21/06/2018	V5 21 de Junio de 2018
Pro.2018.NP1.005 Optimización del recaudo de cartera	Actividad	<p>Modificar la fecha de la actividad "Proveer servicios básicos necesarios para la gestión de cartera de coactiva" así:</p> <p>Anterior Fecha: 15 Jul 2018 Nueva Fecha: 30 Sep 2018.</p>	21/06/2018	V5 21 de Junio de 2018



Modificaciones Plan de Acción



Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2018, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Pro.2018.NC1.003 Posicionamiento de CISA - Sistema Integrado de Información	Actividad	Modificar la fecha de finalización de la actividad "Implementar intranet" así: Anterior Fecha: 15 Jun 2018 Nueva Fecha: 15 Sep 2018.	21/06/2018	V5 21 de Junio de 2018
Pro.2018.NP1.005 Optimización del recaudo de cartera	Actividad	Modificar la fecha de finalización de la actividad "Implementar Procedimiento de Localización" así: Anterior Fecha: 30 Jun 2018 Nueva Fecha: 31 Ago 2018.	21/06/2018	V5 21 de Junio de 2018
Pro.2018.NP1.005 Optimización del recaudo de cartera	Actividad	Modificar la fecha de finalización de la actividad "Ampliar la red de aliados" así: Anterior Fecha: 30 Jun 2018 Nueva Fecha: 31 Ago 2018.	21/06/2018	V5 21 de Junio de 2018
Pro.2018.NP1.005 Optimización del recaudo de cartera	Actividad	Modificar la fecha de finalización de la actividad "Implementar esquema de visitantes" así: Anterior Fecha: 30 Jun 2018 Nueva Fecha: 31 Ago 2018.	21/06/2018	V5 21 de Junio de 2018



Modificaciones Plan de Acción



Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2018, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Pro.2018.NC1.003 Posicionamiento de CISA - Sistema Integrado de Información	Actividad	Modificar la fecha de finalización de la actividad "Optimizar herramientas para la localización de deudores" así: Anterior Fecha: 30 Jun 2018 Nueva Fecha: 30 Sep 2018.	21/06/2018	V5 21 de Junio de 2018
Plan de Mejoramiento de la Contraloría Hallazgo H13 de 2014 "Central de Inversiones S.A. -CISA para la vigencia 2013 presenta una ejecución del 38% en sus ingresos, situación muy similar presentada en las vigencias anteriores (2011 y 2012)"	Actividad	Modificar la fecha de finalización y cantidad de actividades a desarrollar de la actividad "Consolidar la Cartera Coactiva como línea de negocio clave para CISA" así: Anterior Fecha: 01 Sep 2018 Nueva Fecha: 31 Dic 2018. Cantidad de Actividades Vigente: 6 Cantidad de Actividades Propuesta: 4	21/06/2018	V5 21 de Junio de 2018



Modificaciones Plan de Acción



Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2018, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
OA.2018.DE Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano MIPG V2 - 3. Gestión con Valores para Resultados - 8. Participación ciudadana en la gestión pública	Actividad	Modificar la Actividad Nombre Anterior: Actualizar y optimizar la caracterización las partes interesadas de CISA Descripción Anterior: Con base en la caracterización actual y las nuevas líneas de negocio establecidas, realizar una revisión y posterior actualización de la caracterización de las diferentes partes interesadas que intervienen en los procesos de la Entidad. La gerencia de Planeación coordinará la actividad con el apoyo de las vicepresidencias, gerencias y jefaturas involucradas Responsable Anterior: Gerente de Planeación Fecha Final Anterior: 30/06/2018 Nombre Nuevo: Actualizar la metodología para la caracterización de los grupos de interés de CISA Descripción Nueva: Con base en la documentación actual, realizar una revisión de su alcance, y actualizarla si es el caso, de manera que se estandaricen los ejercicios de caracterización de grupos de interés en cuanto a sus responsabilidades, mantenimiento, divulgación y retroalimentación por parte de los áreas de la Entidad. Responsable Nuevo: Gerente de proyectos Fecha Final Nueva: 30/12/2018	21/06/2018	V5 21 de Junio de 2018



Modificaciones Plan de Acción



Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2018, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Actividad	<p>Modificar la fecha de la actividad "Participar en la Rendición de Cuentas Sectorial" así</p> <p>Fecha Anterior: 15/07/2018 Fecha Propuesta: 31/12/2018</p>	10/07/2018	V6 26 de Julio de 2018
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Actividad	<p>Cancelar la actividad "Realizar el monitoreo de riesgos segundo trimestre por parte de los Lideres de los procesos".</p> <p>Modificar el nombre y las fechas de finalización de las actividades "Realizar el monitoreo de riesgos tercer, cuarto trimestre por parte de los Lideres de los procesos" así:</p> <p>Nombre 1: Realizar el monitoreo de riesgos por parte de los Lideres de los procesos – 2 Fecha Propuesta: 30 septiembre de 2018</p> <p>Nombre 2: Realizar el monitoreo de riesgos por parte de los Lideres de los procesos – 3 Fecha Propuesta: 31 de Diciembre de 2018</p>	10/07/2018	V6 26 de Julio de 2018
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Actividad	<p>Cancelar la actividad "Traducir elementos de la pagina web".</p>	10/07/2018	V6 26 de Julio de 2018



Modificaciones Plan de Acción



Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2018, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Plan de Seguridad y Privacidad de la información.	Actividad	<p>Modificar la fecha de finalización de la actividad “Actualizar matriz de requisitos legales de seguridad de la información -1”.</p> <p>Fecha Actual: 30 de junio de 2018 Fecha Propuesta: 30 de Agosto de 2018</p>	10/07/2018	V6 26 de Julio de 2018
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Actividad	<p>Modificar la fecha de finalización de las actividades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobar la Política para el uso de dispositivos móviles 2. Aprobar la Política de mensajes electrónicos 3. Aprobar la Política de Trabajo en casa <p>Fecha Actual: 30 de julio de 2018 Fecha Propuesta: 30 de Septiembre de 2018</p>	23/07/2018	V6 26 de Julio de 2018
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Actividad	<p>Cancelar la actividad “Realizar teleconferencia interactiva”.</p>	23/07/2018	V6 26 de Julio de 2018
Pro.2018.NP1.001 Revisión, análisis y ajuste del modelo de negocio de CISA	Actividad	<p>Modificar la Fecha de la Actividad “Contratar consultoría para Revisión Modelo de Negocio y Plan Estratégico CISA” así:</p> <p>Fecha Actual: 31 de julio de 2018 Fecha Propuesta: 30 de Septiembre de 2018</p>	10/07/2018	V6 26 de Julio de 2018



Modificaciones Plan de Acción



Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2018, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Pro.2018.NC2.001 Dinamizar nuevas líneas de Negocio	Actividad	<p>Modificar el nombre, la descripción y el entregable de la actividad “Determinar necesidades de recursos para proyectos de gestión inmobiliaria.” por</p> <p>Nombre nuevo: Realizar un estudio de la oferta de estructuración de proyectos de gestión inmobiliaria. Descripción Nueva: Analizar dentro de las entidades del estados, cuales de ellas tienen dentro de su portafolio el servicio de estructuración de proyectos de gestión inmobiliaria, y el esquema que utilizan. Entregable Nuevo: Estudio de análisis de oferta Fecha Inicial Nueva: 01/06/2018 Fecha Final Nueva: 01/10/2018</p>	23/07/2018	V6 26 de Julio de 2018
Pro.2018.NC1.003 Posicionamiento de CISA - Sistema Integrado de Información	Indicador	<p>Modificar el indicador “Posicionamiento interno-externo” con las siguientes metas:</p> <p>Meta Actual T1: 0% Meta Actual T2: 30% Meta Actual T3: 60% Meta Actual T4: 60%</p> <p>Nombre Nuevo: Implementación de ferias inmobiliarias Meta Nueva T1: 0 Meta Nueva T2: 0 Meta Nueva T3: 4 Meta Nueva T4: 2</p>	10/07/2018	V6 26 de Julio de 2018



Modificaciones Plan de Acción



Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2018, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Pro.2018.NP1.001 Revisión, análisis y ajuste del modelo de negocio de CISA	Actividad	Modificar la Fecha de la Actividad “Capacitar al equipo comercial de CISA en marketing digital” así: Fecha Actual: 31 de julio de 2018 Fecha Propuesta: Por definir	19/07/2018	V6 26 de Julio de 2018
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Actividad	Modificar la Actividad y la fecha de entrega. Fecha Actual: 30/08/2018 Actividad Anterior: Construir App Mobile para el portafolio inmobiliario. Fecha Propuesta: 15/10/2018 Actividad Propuesta: Rediseñar el landing page de vitrina inmobiliaria y cartera en la página web de CISA. Entregable: Landing page de vitrina inmobiliaria y cartera en producción	17/08/2018	V8 27 de Agosto de 2018



Modificaciones Plan de Acción



Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2018, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Actividad	<p>Actividad Actual: Actualizar y optimizar la caracterización las partes interesadas de CISA</p> <p>Descripción Actual: Con base en la caracterización actual y las nuevas líneas de negocio establecidas, realizar una revisión y posterior actualización de la caracterización de las diferentes partes interesadas que intervienen en los procesos de la Entidad. La gerencia de Planeación coordinará la actividad con el apoyo de las vicepresidencias, gerencias y jefaturas involucradas</p> <p>Responsable Actual: Gerente de Planeación</p> <p>Fecha Final Actual: 30/06/2018</p> <p>Actividad Propuesta: Actualizar la metodología para la caracterización de los grupos de interés de CISA</p> <p>Descripción Propuesta: Con base en la documentación actual, realizar una revisión de su alcance, y actualizarla si es el caso, de manera que se estandaricen los ejercicios de caracterización de grupos de interés en cuanto a sus responsabilidades, mantenimiento, divulgación y retroalimentación por parte de los áreas de la Entidad.</p> <p>Responsable Propuesto: Gerente de proyectos</p> <p>Fecha Final Propuesta: 30/12/2018</p>	27/06/2018	V8 27 de Agosto de 2018



Modificaciones Plan de Acción



Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2018, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Actividad	Eliminar la actividad “Ampliar el rango de conjuntos de datos abiertos” a entregar para el corte 30 de agosto.	17/08/2018	V8 27 de Agosto de 2018
Pro.2018.NC1.003 Posicionamiento de CISA - Sistema Integrado de Información	Actividad	Eliminar la actividad “Optimizar el APP en el negocio de cartera”	14/08/2018	V8 27 de Agosto de 2018
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Actividad	Eliminar la actividad “Realizar el monitoreo de riesgos por parte de los Líderes de los procesos - 2”	25/09/2018	V9 27 de Septiembre de 2018
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Actividad	Modificar la fecha de finalización de la actividad “Realizar auditoria interna al sistema” Fecha Actual: 31/10/2018 Fecha Propuesta: 31/12/2018	25/09/2018	V9 27 de Septiembre de 2018
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Actividad	Modificar la fecha de finalización de la actividad “Aprobar la política para el uso de dispositivos móviles”, “Aprobar política de teletrabajo” y “Aprobar política de mensajes electrónicos” Fecha Actual: 30/09/2018 Fecha Propuesta: 31/10/2018	25/09/2018	V9 27 de Septiembre de 2018



Modificaciones Plan de Acción



Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2018, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
MIPG V2 - 5. Información y Comunicación - 10. Gestión Documental	Actividad	<p>Actividad Actual: Implementar los requisitos de los documentos electrónicos de archivo Descripción Actual: Implementar los requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, preservación y metadatos de los documentos electrónicos de archivo en el Sistema de Gestión de Documento Electrónico. Responsable Actual: Gerente de Recursos Fecha Final Actual: 30/09/2018</p> <p>Actividad Propuesta: Elaborar plan para la Implementación los requisitos de los documentos electrónicos de archivo Descripción Propuesta: Plan para la implementación de los requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, preservación y metadatos de los documentos electrónicos de archivo en el Sistema de Gestión de Documento Electrónico</p> <p>Fecha Final Propuesta: 30/12/2018</p>	25/09/2018	V9 27 de Septiembre de 2018



Modificaciones Plan de Acción



Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2018, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Pro.2018.NP1.005 Optimización del recaudo de cartera	Actividad	<p>Actividad Actual: Ampliar Red de aliados Descripción Actual: Implementar Procedimiento de adscripción de Aliados Convocar y estudiar a empresas interesadas en la cobranza de la cartera de CISA Fecha Final Actual: 31/08/2018 Entregable Actual: Adscripciones formalizadas</p> <p>Descripción Propuesta: Contratar Aliados de Cobranza a través de un concurso público. Fecha Final Propuesta: 31/12/2018 Entregable: Adjudicación de contratos a los nuevos Aliados de Cobranza</p>	25/09/2018	V9 27 de Septiembre de 2018
Pro.2018.NP1.005 Optimización del recaudo de cartera	Actividad	<p>Actividad Actual: Localizar deudores con apoyo de terceros Descripción Actual: Convocar y estudiar a empresas interesadas para trabajar con CISA en la localización de clientes Contratar con empresas especializadas en localización. Fecha Final Actual: 31/08/2018 Entregable Actual: Contratos formalizados</p> <p>Fecha Final Propuesta: 14/09/2018</p>	25/09/2018	V9 27 de Septiembre de 2018



Modificaciones Plan de Acción



Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2018, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Pro.2018.NP1.005 Optimización del recaudo de cartera	Actividad	Actividad Actual: Proveer servicios básicos necesarios para la gestión de cartera de coactiva Fecha Final Actual: 30/09/2018 Fecha Final Propuesta: 30/11/2018	25/09/2018	V9 27 de Septiembre de 2018
Pro.2018.NA1.001 Diseñar el Modelo de Gestión del Talento Humano para CISA Pro.2018.NA1.002 Fortalecer el liderazgo basado en la confianza	Indicador	Modificar la fecha de medición de los indicadores asociados a los planes de la Gerencia de Recursos: <ul style="list-style-type: none">• % de mejora en la calificación de gestión del desempeño organizacional• % de mejora en la percepción de líderes	16/10/2018	V10 29 de Octubre de 2018
Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano	Actividad	Eliminar la actividad “Capacitar sobre rendición de cuentas” cuyo alcance se determina como: Realizar una capacitación con expertos en rendición de cuentas que permita a la Entidad entender la importancia de este ejercicio como entidad que hace parte del poder público	15/10/2018	V10 29 de Octubre de 2018



Gracias


Anexo 1: Informe de Cumplimiento de actividades detallado

Septiembre 2018

Ejecución Actividades Detallada



Proyectos Estratégicos 2018

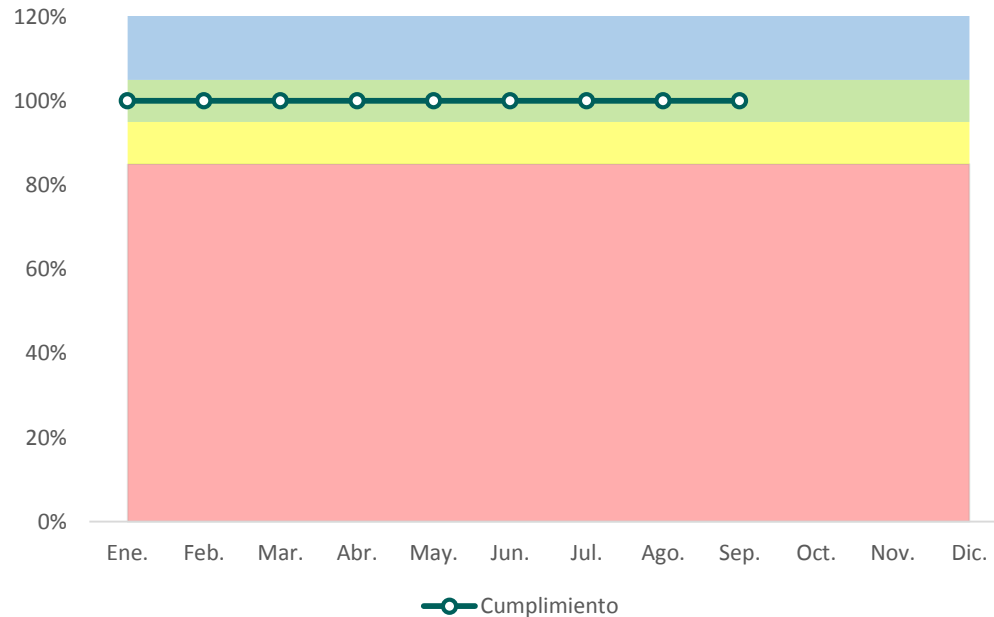

Análisis:

Al 30 de septiembre de 2018, se ha obtenido un cumplimiento acumulado de 100% lo que lo configura como excelente, conforme a lo planeado por los diferentes procesos institucionales. No obstante, se han efectuado algunas actividades fuera del tiempo planeado. Se destacan actividades tales como la ampliación del convenio de comercialización de inmuebles con la Policía Nacional, el diseño del modelo de costos de para la fabrica de software, el diseño de nuevos esquemas de seguimiento y control para el cobro de cartera y diversos estudios de mercado que permitan focalizar esfuerzos en las necesidades de las entidades estatales, entre otras. (para mayor detalle ver anexo 1)

Convenciones



Actividad Completada en el tiempo y con el alcance planteado



Actividad completada fuera del tiempo planteado



Actividad rezagada




Detalle Proyectos Estratégicos 2018



PROYECTOS ESTRATÉGICOS

NUESTROS CLIENTES




- Diseño y propuesta del marco normativo para la ley de gestión de activos públicos.
- Diseño y propuesta del marco normativo para el Plan Nacional de Desarrollo.
- Posicionamiento de CISA – Sistema Integrado de Información
- Dinamizar nuevas líneas de Negocio
- Optimización del modelo de costos de la fábrica de software CISA

1

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

NUESTROS PROCESOS




- Revisión, análisis y ajuste del modelo de negocio de CISA
- Consolidación de Cartera Coactiva
- Fortalecimiento de las líneas de negocio tradicionales
- Optimización Movilización de Inmuebles
- Optimizar el esquema de saneamiento de inmuebles
- Optimización del recaudo de cartera

2

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

NUESTRO APRENDIZAJE



- Diseñar el Modelo de Gestión del Talento Humano para CISA
- Fortalecer el liderazgo basado en la confianza

3

* Para detalle de cada proyecto haga Clic en la viñeta correspondiente



Proyectos Estratégicos – Nuestros Clientes



Diseño y propuesta del marco normativo para la ley de gestión de activos públicos.



Justificación	Es necesario contar una ley que empodere a CISA como el colector de activos públicos del estado y unificar las disposiciones en materia de gestión de activos estatales. Actualmente existe dispersión de normas que impide un manejo eficiente y centralizado de los activos públicos.
Objetivo	Contar con herramientas jurídicas que consoliden a CISA como único colector de activos del estado colombiano
Descripción	Propender por diseñar un marco normativo de gestión de activos públicos, buscando consolidar en un solo cuerpo normativo las disposiciones en materia de movilización de activos (cartera e inmuebles) y colector de activos estatales.
Responsable	Todas las vicepresidencias de la entidad - coordina la vicepresidencia jurídica.

Indicador	Generación Proyecto de Ley de Gestión de Activos públicos aprobada ante las instancias internas de CISA			
Metas	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre
	0	0	0	1



Proyectos Estratégicos – Nuestros Clientes



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar mesas de trabajo internas	Mesa de trabajo con Gerente de Cobranzas y Otros Activos (Tema cartera y coactivo). Mesa de trabajo con Gerente Contable y Operativo (Tema beneficios tributarios venta inmuebles a terceros y necesidades específicas).	Acta de las mesas de trabajo	Vicepresidente Jurídica	28/03/2018	
Realizar reuniones interinstitucionales	Sensibilizar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre el resultado de las mesas de trabajo adelantadas y necesidades puntuales de CISA para incluirlas en el proyecto de Ley.	Informe de la reunión	Vicepresidente Jurídica	29/06/2018	
Analizar Ley de Gestión de Activos de Corea	Análisis de la Ley de Gestión de Activos de Corea traducida.	Informe contentivo del análisis de la ley	Vicepresidente Jurídica	31/12/2018	
Generar proyecto de Ley	Contar con el proyecto de articulado de Ley de Gestión de Activos Públicos y sensibilizar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre el mismo.	Documento contentivo del proyecto	Vicepresidente Jurídica	31/12/2018	



Proyectos Estratégicos – Nuestros Clientes



Diseño y propuesta del marco normativo para el Plan Nacional de Desarrollo.

Justificación	Se requiere reglamentar las necesidades internas en materia de gestión de activos públicos. Igualmente es procedente complementar aquella normatividad vigente, de acuerdo a los requerimientos de las áreas misionales.
Objetivo	Contar con herramientas jurídicas que permitan a la entidad fortalecer las líneas de negocio actuales. (Cartera, inmuebles y venta de participación minoritaria de acciones de la nación.)
Descripción	Focalizar el diseño y propuesta del marco normativo del Plan Nacional de Desarrollo, respecto a la movilización de activos (cartera, inmuebles y venta de participación minoritaria de acciones de la nación.) Se instrumentará un proyecto de articulado para incluir los siguientes aspectos: a) cobro coactivo - condonación de intereses, b) beneficios tributarios en la movilización de inmuebles con particulares.
Responsable	Todas las vicepresidencias de la entidad - coordina la vicepresidencia jurídica

Indicador	Generación Proyecto articulado para el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022			
Metas	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre
	0	0	0	1



Proyectos Estratégicos – Nuestros Clientes



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar mesas de trabajo internas	Mesa de trabajo con Gerente de Cobranzas y Otros Activos (Tema cartera y coactivo). Mesa de trabajo con Gerente Contable y Operativa (Tema beneficios tributarios venta inmuebles a terceros y necesidades específicas). Público, respecto a la interpretación de la forma de pago de los inmuebles movilizados por PND	Actas de mesas de trabajo	Vicepresidente Jurídica	29/06/2018	
Analizar respuestas del MHCP - PND	Conforme el resultado de las mesas de trabajo y del análisis de las respuestas del MHCP, estructurar un proyecto de articulado para que sea incluido en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, con los siguientes temas, entre otros: Posibilidad de ofrecer en venta inmuebles mediante la activación de subasta o puja al 100% del avalúo comercial, con rondas de ofrecimientos sucesivos con descuentos del 10% del valor del inmueble hasta un máximo del 50% de descuento. b. Permitir la donación de bienes que no generen rentabilidad a CISA a otras entidades públicas para que sean destinados a proyectos de reparación de las víctimas del conflicto armado. c. cobro coactivo - condonación de intereses, d. beneficios tributarios en la movilización de inmuebles con particulares.	Documento contentivo del proyecto de articulado a incluir en el PND	Vicepresidente Jurídica	30/09/2018	
Realizar reuniones de sensibilización el MHCP	Reunión de sensibilización con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público respecto del proyecto trabajado de PND.	Acta de reunión	Vicepresidente Jurídica	31/12/2018	
Generar borrador de articulado para PND	Preparar proyecto de articulado a incluir en la el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022	Documento contentivo del proyecto de articulado en la Ley de PND	Vicepresidente Jurídica	31/12/2018	



Proyectos Estratégicos – Nuestros Clientes



Posicionamiento de CISA – Sistema Integrado de Información

Justificación	Actualmente no existe mecanismo para alimentar de manera sistemática, ordenada y coherente la información que se origina en CISA y que debe ser comunicada no solo oportunamente sino eficientemente a todos los grupos de interés. Partiendo de las metas y compromisos del plan estratégico 2015-2018, la jefatura de Comunicaciones y Relacionamiento se propone crear un Sistema Integrado de Información que atienda a todos los grupos de interés oportuna, coherente y permanentemente de tal manera que se garantice el cumplimiento de los objetivos planteados para este proyecto.
Objetivo	Crear un Sistema Integrado de Información que atienda a todos los grupos de interés oportuna, coherente y permanentemente de tal manera que se garantice el cumplimiento de los objetivos planteados para este proyecto.
Descripción	Con la creación del Sistema Integrado de Información, SIF, se busca enrutar a la entidad hacia la transformación digital y por ello el principio de este proyecto es identificar los canales principales para los grupos de interés de CISA, de tal manera que con el rediseño y desarrollo de la intranet y el rediseño y desarrollo del sitio web, CISA se ubica en la autopista de la comunicación digital y convierte esta dos herramientas en el "HUB" o concentrador de la información, que alimentado sistemáticamente, va a comunicar oportuna, coherente y permanentemente a todos sus grupos de interés.
Responsable	Comunicaciones Corporativas

Indicador	Implementación de ferias inmobiliarias (Acumulada)			
Metas	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre
	0	0	4	6



Proyectos Estratégicos – Nuestros Clientes



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Incorporar el Sistema Integrado de Información y sus anexos al manual 14.	Modificar el manual 14 (política de comunicaciones) y crear los anexos que soporten dichos cambios, publicarlo en el SIG y comunicarlo a la organización	Manual 14 actualizado	Comunicaciones	16/03/2018	
Desarrollar Intranet	Es la fase de código o backend	Ambiente de prueba del backend/imagen/url	Comunicaciones	24/04/2018	
Socializar los anexos a cada proceso y fijar los compromisos	socializar los anexos y formatos a cada uno de los líderes de proceso en una reunión dónde se hagan los acuerdos de entrega de la información a comunicar para operativizar el "SIF"	Actas de socialización de anexos y formatos	Comunicaciones	30/04/2018	
Estructurar proyecto página web/ identificación de etapas y definición de alcance	Levantamiento de la información para la generación de los términos y definición del alcance.	Elaboración del proyecto de términos de referencia.	Comunicaciones y Tecnología	30/04/2018	
Ejecutar la Fase II Campaña de posicionamiento	Lanzamiento de la campaña digital. (pauta en los medios y tiempos definidos)	Pauta de CISA en medios digitales. (avisos y reporte de impacto)	Comunicaciones	31/07/2018	



Proyectos Estratégicos – Nuestros Clientes



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Implementar intranet	Puesta en marcha de la nueva intranet	Intranet funcionando y siendo alimentada y/o actualizada permanentemente.	Comunicaciones	15/09/2018	
Capacitar al equipo comercial de CISA en marketing digital	Capacitación con el equipo de GOOGLE Colombia, en lo que se denomina GOOGLE DAY CISA	Encuentro físico para DG y BOG, y virtual para las sucursales con Google	Comunicaciones	15/10/2018	



Proyectos Estratégicos – Nuestros Clientes



Dinamizar nuevas líneas de Negocio

Justificación	Con el animo de asegurar la sostenibilidad financiera de la Entidad, se requiere buscar alternativas adicionales a las líneas tradicionales
Objetivo	Incrementar la participación de las nuevas líneas de negocio en el P&G de la Entidad
Descripción	Generar para cada línea de servicio no tradicional, la ejecución de actividades que permitan generar nuevos negocios rentables
Responsable	Vicepresidente de Negocios/Gerente de Proyectos

Indicador	% de Cumplimiento de Presupuesto acumulado para líneas de negocio no tradicionales			
Metas	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre
	95%	95%	95%	95%



Proyectos Estratégicos – Nuestros Clientes



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Posicionar a CISA ante Fonvivienda	Optimizar la prestación de servicios a Fonvivienda con el objetivo de lograr la ampliación del alcance de los contratos que se encuentran vigentes	Contrato y ampliaciones Firmadas	Vicepresidente de Negocios/Gerente de Proyectos	01/02/2018	
Comercializar Zonas Francas	Realizar gestiones ante el Ministerio de Comercio orientadas a lograr la comercialización de las zonas francas a través de CISA	Convenio Firmado	Vicepresidente de Negocios	01/02/2018	
Ampliar convenio de comercialización de inmuebles con la Policía Nacional	Ampliación del convenio Marco con Policía Nacional (inmuebles por valor de \$4.400 millones).	Convenio Ampliado	Vicepresidente de Negocios	31/03/2018	
Capacitar a ejecutivos en venta de Software Estado	Fortalecer las capacidades del equipo de la VSE a fin que tengan las herramientas necesarias para la comercialización del servicio Software Estado	Ejecutivos capacitados - Listas de asistencia	Vicepresidente de Negocios/Gerente de Tecnología	01/04/2018	
Realizar un estudio de mercado para el servicio de Enajenación de Participaciones Accionarias	Identificar las entidades potenciales para la comercialización del servicio de enajenación de participaciones accionarias	Estudio de mercado realizado	Gerente de Proyectos	06/04/2018	



Proyectos Estratégicos – Nuestros Clientes



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Reestructurar el servicio de venta de bienes muebles	Realizar un diagnostico con el estado actual del proceso de subasta de bienes muebles identificando los aspectos operativos, administrativos y financieros más relevantes que afectan su efectividad y definir la forma en que se deberá prestar el servicio.	Diagnóstico realizado	Gerente de Proyectos	01/05/2018	
Realizar un estudio de mercado para el servicio de Software Estado	Identificar las entidades potenciales para la comercialización del servicio de Software Estado	Estudio de mercado realizado	Gerente de Proyectos	31/05/2018	
Estructurar el servicio de participaciones accionarias	Estructurar el servicio de participaciones accionarias bajo la metodología de Gerente por proyectos	Servicio estructurado	Gerente de Proyectos	01/07/2018	
Estructurar servicio de vitrina permanente para la venta de bienes muebles	Determinar la viabilidad financiera y operativa del servicio y de ser viable, Incorporarlo dentro del servicio de subasta de bienes muebles	Servicio estructurado	Gerente de Proyectos	01/07/2018	
Reestructurar el servicio de venta de bienes muebles Fase 2	Con base en el diagnostico del estado actual del proceso de subasta de bienes muebles definir la forma en que se deberá prestar el servicio.	Servicio reestructurado con base en el diagnostico	Gerente de Proyectos	30/08/2018	
Realizar un estudio de la oferta de estructuración de proyectos de gestión inmobiliaria.	Analizar dentro de las entidades del estados, cuales de ellas tienen dentro de su portafolio el servicio de estructuración de proyectos de gestión inmobiliaria, y el esquema que utilizan.	Estudio de análisis de oferta	Gerente de Proyectos	01/10/2018	
Estructurar servicio de vitrina permanente para la venta de bienes muebles Fase 2	Colocar en operación la estructuración del servicio de subasta de bienes muebles a través de venta permanente	Servicio en operación	Gerente de Proyectos	31/10/2018	



Proyectos Estratégicos – Nuestros Clientes



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Desarrollar la plataforma para subastas de bienes muebles	Desarrollar software necesario para la puesta en marcha de subastas electrónicas si el estudio de reestructuración del servicio así lo amerita	Plataforma en funcionamiento	Gerente de tecnología	01/12/2018	



Proyectos Estratégicos – Nuestros Clientes



Optimización del modelo de costos de la fábrica de software CISA

Justificación	La rentabilidad de los negocios de base tecnológica debe calcularse con base en servicios y no en proyectos, CISA debe contar con un modelo de costos de TI a partir de la proyección de la demanda de cada servicio y los costos asociados a cada uno de éstos. Con base en lo anterior, debe definir un conjunto de tarifas unitarias por transacción/unidad representativas de cada servicio. (Drivers de comportamiento fijo y variable, Variables estándar del Cliente y Costos X Actividad)
Objetivo	Refinar el cálculo de los gastos operacionales de la fábrica de software para mejorar la rentabilidad esperada de los proyectos de Software Estado y de los demás proyectos de base tecnológica que se respalden en las capacidades técnicas de la Gerencia.
Descripción	El modelo a definir se aplicara para: a) Proyectos de Software como Servicio (SaaS) de aplicaciones CISA - Software Estado, b) Proyectos de Software por Demanda para Entidades del Estado, c) Proyectos de Infraestructura como Servicio (IaaS) para Entidades del Estado y Clientes de SW Estado/SW X Demanda, d) Proyectos de Gobierno de Datos (Análítica de datos)
Responsable	Gerente de Tecnología y Sistemas de Información

Indicador	Porcentaje de implementación del Modelo de Costos Fábrica de Software			
Metas	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre
	60%	80%	100%	100%



Proyectos Estratégicos – Nuestros Clientes



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Parte 1: modelo conceptual de costos Definir de las bases del modelo	Reconocimiento del grado de madurez de la operación tecnológica de CISA, los servicios a prestar (actuales y nuevos en el portafolio) y demás premisas a considerar para el diseño.	Documento de Definición del modelo de costos de la fábrica de SW CISA	Gerente de Tecnología	15/02/2018	
Parte 1: modelo conceptual de costos Diseñar el modelo de costos	Diseño y construcción del modelo general de costos Definición de parámetros y drivers para la operación del modelo.	Modelo Conceptual de Costos	Gerente de Tecnología/Gerente de Valoración	15/03/2018	
Parte 2: cálculo de tarifas y operación Calcular las tarifas	Mapeo del Catálogo de servicios e identificación de la información histórica requerida. Estimación de consumos futuros y proyección de costos asociados. Cálculo de tarifas según el modelo de costos	Lista de tarifas por tipo de servicio	Gerente de Tecnología/Gerente de Valoración	30/03/2018	
Parte 2: cálculo de tarifas y operación Medir	Recopilar información de volúmenes de consumo. Recopilar información de costos reales (contabilidad) Análisis de comportamiento del modelo en función de la rentabilidad real vs. la esperada.	Informe de comportamiento del modelo de costos en función de la rentabilidad real vs. rentabilidad esperada.	Gerente de Tecnología/Gerente de Valoración	30/06/2018	
Parte 2: cálculo de tarifas y operación Cobrar al cliente	Revisar condiciones pactadas en Acuerdos de Niveles de Servicio con los clientes. Recalculo de precios a cobrar según volúmenes, costos, márgenes, modelo de precios y esquema de cobro seleccionado.	Informe de modificaciones al modelo de acuerdo a las nuevas condiciones reveladas e integradas al modelo de costos.	Gerente de Tecnología/Gerente de Valoración	30/08/2018	



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



Consolidación de la Cartera Coactiva

Justificación	Una vez obtenida en 2016 la facultad de cobro coactivo, se requiere establecer una estrategia que permita traer negocios de este tipo de acuerdo a las proyecciones presupuestales definidas
Objetivo	Consolidar la cartera coactiva como una línea de negocio rentable para la Entidad
Descripción	Diseñar estrategia para determinar el mercado objetivo, el esquema de acercamiento para la nueva administración nacional y para cumplir las metas de adquisición de cartera coactiva
Responsable	Vicepresidente de Negocios

Indicador	% de Cumplimiento de Presupuesto acumulado de Cartera Coactiva a adquirir			
Metas	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre
	95%	95%	95%	95%



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Definir y segmentar mercado objetivo Primer Semestre	Realizar una priorización del mercado objetivo para efectuar negociaciones con entidades con convenios firmados antes que comience a operar la ley de garantías.	Cronograma de visitas programado	Vicepresidente de Negocios	15/02/2018	
Definir y segmentar mercado objetivo Segundo Semestre	Realizar una segmentación del mercado para definir entidades objetivo para el segundo semestre del año	Cronograma de visitas programado	Vicepresidente de Negocios	01/09/2019	
Elaborar plan de visitas y estrategia de acercamiento nuevo gobierno	Definir una estrategia para realizar acercamientos a los nuevos mandatarios nacionales y establecer un plan de visitas para el segundo semestre del año, posterior a sus posesiones	Estrategia y plan de visitas diseñado	Vicepresidente de Negocios	01/09/2018	
Ejecutar la estrategia de acercamiento	Con base en la estrategia definida y el plan de visitas planteado, ejecutar las acciones correspondientes para lograr el acercamiento esperado	Visitas realizadas	Vicepresidente de Negocios	31/12/2018	



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



Fortalecimiento de las líneas de negocio tradicionales

Justificación	La generación de inventario de inmuebles y cartera no ha correspondido con las expectativas institucionales en los últimos años, afectando el cumplimiento de las metas de movilización
Objetivo	Focalizar la gestión de la Vicepresidencia de Negocios en la adquisición de activos con mejor proyección de recuperación
Descripción	Segmentar los mercados objetivos tanto para cartera como para inmuebles. Analizar oportunidades a partir de la generación de las propuestas de gobierno del presidente electo
Responsable	Vicepresidente de Negocios

Indicador	% de Cumplimiento de adquisición acumulada de inmuebles y cartera			
Metas	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre
	95%	95%	95%	95%



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Diseñar estrategia de acercamiento a universidades y clientes especiales de cartera	Definir una estrategia que permita el acercamiento efectivo a universidades y entidades con vocación de generación de cartera.	Estrategia de acercamiento diseñada	Vicepresidente de Negocios	15/02/2018	
Implementar la estrategia de generación de cartera	Ejecutar la estrategia definida para el acercamiento a los clientes definidos	Visitas realizadas	Vicepresidente de Negocios	30/06/2018	
Elaborar plan de visitas y estrategia de acercamiento nuevo gobierno	Definir una estrategia para realizar acercamientos a los nuevos mandatarios nacionales y establecer un plan de visitas para el segundo semestre del año, posterior a sus posesiones	Estrategia y plan de visitas diseñado	Vicepresidente de Negocios	01/09/2018	
Analizar e identificar oportunidades para CISA en el PND 2018-2022 propuesto	Análisis del plan de gobierno del presidente electo para la generación de esquemas de acercamiento a fin de incorporar en el nuevo PND herramientas legales que permitan mejorar la gestión de CISA	Documento de análisis de oportunidades	Vicepresidente de Negocios /Gerente de Proyectos	31/12/2018	
Generar borrador de Modificación del Articulado - Ley de Presupuesto	Preparar proyecto de articulado a incluir en la Ley de Presupuesto 2019, consistente en la posibilidad de devolver a las entidades los recursos provenientes de la venta de los inmuebles.	Documento contentivo del proyecto de articulado en la Ley de Presupuesto	Vicepresidente Jurídica	31/12/2018	



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



Optimización Movilización de Inmuebles

Justificación	<ol style="list-style-type: none">1. Las acciones realizadas en los planes de acción de años anteriores no han permitido cerrar la brecha entre lo presupuestado y lo ejecutado en lo correspondiente a movilización de inmuebles2. La Estrategia utilizada no esta generando los resultados esperados y cada vez se aumenta el tiempo del inventario remanente en la Entidad.
Objetivo	Cumplir el presupuesto de movilización de inmuebles.
Descripción	A partir de la implementación de las acciones se busca la movilización del inventario de inmuebles mejorando los tiempos de comercialización.
Responsable	Vicepresidente de Negocios / Gerente de Inmuebles

Indicador	% de cumplimiento de Presupuesto acumulado de inmuebles			
Metas	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre
	95%	95%	95%	95%



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Incentivar a los Agentes externos inmobiliarios	Aplicar la costumbre comercial del 3% de comisión para todas las ventas en bien urbano y 5% en bien rural durante el primer semestre del año 2018.	Plan de incentivos generado y operando	Gerente de Inmuebles y Otros Activos	30/01/2018	
Focalizar esfuerzos comerciales en sucursales	Generar un esquema de seguimiento y control, segmentando del portafolio en las sucursales entre Gerente y Analista.	Esquema de seguimiento diseñado e implementado	Gerente de Inmuebles y Otros Activos	30/03/2018	
Generar alianzas con Entidades Financieras	Realizar alianzas con diferentes entidades financieras, que permitan a los clientes tener opciones de financiación para la adquisición de los inmuebles en CISA.	Alianzas realizadas y establecidas en la circular 69.	Gerente de Inmuebles y Otros Activos	30/07/2018	
Ajustar política de precios de venta	Ajuste en Política orientada a ventas por P & G. Publicación de precios mínimos de venta para todo el portafolio de manera permanente.	Política de precios ajustada, difundida e implementada	Gerente de Inmuebles y Otros Activos	30/08/2018	
Realizar ferias inmobiliarias en cada sucursal	Diseñar un cronograma de ferias operadas por CISA, donde cada sucursal promocióne el portafolio a nivel nacional.	Cronograma diseñado	Gerente de Inmuebles y Otros Activos	31/10/2018	



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



Optimizar el esquema de saneamiento de inmuebles



Justificación	<ol style="list-style-type: none">1. Es necesario disminuir el tiempo de alistamiento de los inmuebles, lo que permita optimizar la movilización de los mismos.2. La Estrategia utilizada no esta generando los resultados esperados y cada vez se aumenta el tiempo del remanente en la Entidad.
Objetivo	Aumentar la disponibilidad de inventario comercializable
Descripción	A partir de un diagnostico sobre la totalidad de los inmuebles en proceso de saneamiento, definir e implementar acciones que permitan aumentar el número de bienes con posibilidad de comercialización.
Responsable	Vicepresidente de Saneamiento

Indicador	# de inmuebles saneados			
Metas	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre
	3	11	20	15



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar el diagnóstico del estado de saneamiento de inmuebles de CISA	Efectuar un inventario de la totalidad de los inmuebles en saneamiento que contenga como mínimo: a) El alcance de saneamiento requerido. b) La tipificación de situaciones de gestión por saneamiento. c) El tiempo promedio por tipologías para el saneamiento. d) Definición de insumos que se requieren para lograr el saneamiento.	Inventario de inmuebles por sanear actualizado con tiempos estimados	Vicepresidente de Saneamiento	30/03/2018	
Segmentar y priorizar el universo de inmuebles a sanear	Con base en el diagnóstico, segmentar y priorizar los inmuebles de acuerdo un criterio establecido, fijando un plan de choque. Unificación de plan de acción a partir del diagnóstico realizado por grupo de inmuebles.	Inmuebles priorizados para ejercicio de saneamiento	Vicepresidente de Saneamiento	30/03/2018	
Realizar capacitaciones técnicas en saneamiento	Realizar ejercicios de capacitación para los siguientes usuarios: a) Técnicos de inmuebles DG. b) Coordinadores de Inmuebles en sucursales en temas técnicos. c) Con funcionarios responsables de saneamiento en diferentes entidades públicas, con miras a la consolidación de red institucional.	Listas de asistencia a capacitaciones realizadas	Vicepresidente de Saneamiento	30/10/2018	
Proponer ajustes normativos externos que permitan la optimización de tiempos de saneamiento	Gestionar con las entidades competentes, la expedición de lineamientos que den prelación a los trámites que gestione CISA, como Colector de Activos Públicos en función de la monetización de recursos para el Estado.	lineamientos expedidos	Vicepresidente de Saneamiento	31/10/2018	
Implementar el saneamiento para los inmuebles priorizados	Realizar el saneamiento de los inmuebles de acuerdo a la segmentación y priorización realizada.	Inmuebles saneados	Vicepresidente de Saneamiento	30/12/2018	



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



Revisión, análisis y ajuste del modelo de negocio de CISA

Justificación	Desde 2012 CISA ha venido realizando acciones orientadas a la optimización del retorno de activos, sin embargo, la dinámica de las líneas de negocio tradicionales no ha permitido asegurar la auto sostenibilidad de la entidad, por lo tanto, es necesario realizar una revisión del modelo de negocio
Objetivo	Orientar a CISA hacia unas condiciones de auto sostenibilidad financiera
Descripción	Realizar un análisis interno y externo a través de una consultoría que considere los lineamientos impartidos por el MHCP como accionista mayoritario de la entidad, así como de los miembros de junta directiva como responsables del direccionamiento de la Entidad. De este modo, generar recomendaciones para optimizar el modelo e incorporarlas en el plan estratégico 2019-2022
Responsable	Presidente y Gerente de Planeación

Indicador	Documentos generados			
Metas	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre
	0	0	0	3



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Contratar Consultor Externo para apoyar a CISA en la definición de su Plan Estratégico	Realizar el proceso de contratación para la consultoría de revisión, análisis y ajuste del modelo de negocio una vez terminada la ley de garantías	Contrato suscrito	Gerente de Planeación	31/10/2018	
Realizar análisis con participación de Externos, Equipo Directivo y JD	Realizar los análisis en desarrollo de la consultoría	Actas de reunión	Gerente de Planeación	31/12/2018	
Generar recomendaciones y ajustes al Modelo de Negocio de CISA	Realizar los análisis en desarrollo de la consultoría	Documento final de consultoría	Gerente de Planeación	31/12/2018	
Identificar posibles proyectos para el Plan Estratégico 2019-2022	Generar posibles proyectos de acuerdo a las recomendaciones planteadas por la consultoría como insumo para la generación del plan estratégico institucional 2019-2022	Proyectos identificados	Gerente de Planeación	30/01/2018	



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



Optimización del recaudo de cartera

Justificación	CISA considera que es posible aumentar el recaudo de cartera optimizando actividades propias de la gestión de cartera
Objetivo	Aumentar el recaudo de cartera
Descripción	Realizar actividades en diversos frentes de la gestión de cartera con el fin de optimizar la gestión de cobranza Realizar las acciones requeridas para fortalecer la capacidad institucional para la gestión de cartera coactiva, en lo concerniente a sistemas de información y notificación.
Responsable	Gerente de Cobranza

Indicador	% de Cartera recaudada acumulada			
Metas	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre
	95%	95%	95%	95%



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Determinar necesidades de interoperabilidad	Determinar, mediante un diagnostico, las necesidades de información para el funcionamiento adecuado del cobro de cartera coactiva.	Documento de necesidades levantado	Gerente de Normalización de Cartera	01/03/2018	
Diseñar un nuevo esquema de seguimiento y control	Diseñar un nuevo esquema de seguimiento y control que permita realizar el seguimiento oportuno a las sucursales en lo referente a la cobranza Pre-jurídica, Jurídica y procesos concursales en DG	Procedimiento ajustado	Gerente de Normalización de Cartera	31/03/2018	
Optimizar herramientas para la localización de deudores	Implementar Procedimiento de Localización	Procedimiento definido y formalizado	Gerente de Normalización de Cartera	31/08/2018	
Implementar esquema de visitantes	Diseñar e implementar el procedimiento de visitas a los clientes	Procedimiento definido y formalizado	Gerente de Normalización de Cartera	31/08/2018	
Localizar deudores con apoyo de terceros	Convocar y estudiar a empresas interesadas para trabajar con CISA en la localización de clientes Contratar con empresas especializadas en localización	Contratos formalizados	Gerente de Normalización de Cartera	30/09/2018	



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Proveer servicios básicos necesarios para la gestión de cartera de coactiva	Realizar la estructuración y puesta en funcionamiento de los contratos para el software de cobro coactivo y servicio de correspondencia	Contrato firmado	Gerente de Proyectos/Gerente de Recursos	30/11/2018	
Realizar ventas de cartera	Analizar el portafolio a vender y Efectuar ventas cada tres meses	4 procesos de ventas de cartera realizados	Vicepresidente de Saneamiento	31/12/2018	
Suscribir convenios de interoperabilidad	Realizar los acercamientos con diferentes entidades a nivel nacional y territorial (Catastros independientes, DIAN, Min Salud, Min Transporte, Cámaras de Comercio, Agremiaciones.)que puedan suministrar información de acuerdo a las necesidades de CISA y generar convenios de interoperabilidad	Convenios de interoperabilidad suscritos	Vicepresidente de Negocios /Gerente de Proyectos	31/12/2018	
Ampliar la red de aliados	Contratar Aliados de Cobranza a través de un concurso público	Adjudicación de contratos a los nuevos Aliados de Cobranza	Gerente de Normalización de Cartera	31/12/2018	



Proyectos Estratégicos – Nuestro Aprendizaje



Diseñar el Modelo de Gestión del Talento Humano para CISA

Justificación	CISA a la fecha no cuenta con un modelo de gestión humana armonizado con altos estándares que le permita manejar de manera eficiente el talento humano.
Objetivo	Implementar un Modelo de Gestión Humana, adaptado a las necesidades de la entidad que le permita operar con personal que cuente con las competencias integrales para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales
Descripción	Analizar los procesos de selección por competencias, Gestión del desarrollo humano y profesional, gestión de la compensación y gestión del desempeño, con el fin de formular un modelo adaptable a la entidad, con políticas claras y mediciones precisas.
Responsable	Gerencia de Recursos

Indicador	% de mejora en la calificación de gestión del desempeño organizacional			
Metas	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre
	0%	0%	0.4%	0%



Proyectos Estratégicos – Nuestro Aprendizaje



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Analizar los gaps en lo referente a las competencias integrales tanto por área como por persona y Generar el plan individual de desarrollo y desempeño	Proceso: Gestión del desarrollo humano y profesional	Plan Individual formulado	Gerente de Recursos	31/03/2018	
Redefinir competencias tipo de los colaboradores de CISA alineadas a la estrategia	Ajuste y actualización del Proceso de Selección por Competencias	Competencias organizacionales documentadas y formalizadas	Gerente de Recursos	31/07/2018	
Adecuar el proceso selección de personal con base en las competencias definidas	Ajuste y actualización del Proceso de Selección por Competencias	Circular 24 ajustada	Gerente de Recursos	31/07/2018	
Formular e implementar el plan institucional de capacitaciones	Proceso: Gestión del desarrollo humano y profesional	PAC ejecutado	Gerente de Recursos	31/12/2018	
Realizar evaluaciones de desempeño y toma de acciones	Proceso: Gestión del desarrollo humano y profesional	Informe gerencial de desempeño	Gerente de Recursos	31/12/2018	



Proyectos Estratégicos – Nuestro Aprendizaje



Fortalecer el liderazgo basado en la confianza



Justificación	Se han percibido debilidades en la manera como los líderes direccionan a la Entidad en todos sus niveles, perdiendo la inspiración que debe generar en los colaboradores de la organización
Objetivo	Fortalecer competencias de liderazgo que permitan generar confianza en la alta dirección
Descripción	Realizar un análisis de los resultados sobre liderazgo en la institución, basado en esto, diseñar acciones que permitan fortalecer el liderazgo basado en la confianza.
Responsable	Gerencia de Recursos

Indicador	% de mejora en la percepción de líderes			
Metas	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre
	0%	0%	0.6%	0%



Proyectos Estratégicos – Nuestro Aprendizaje




Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Generar diagnóstico sobre liderazgo	El diagnostico se elabora basado en los resultados de la encuesta de felicidad corporativa, evaluación de riesgo psicosocial y evaluación del desempeño	Diagnóstico elaborado	Gerente de Recursos	15/02/2018	
Realizar actividades de liderazgo	Realizar actividades enfocadas en el desarrollo de competencias de liderazgo basadas en la confianza	Actividades desarrolladas	Gerente de Recursos	31/08/2018	
Realizar la medición de control y toma de decisiones	Realizar medición de felicidad corporativa, evaluación de riesgo psicosocial y evaluación del desempeño	Informe gerencial de liderazgo	Gerente de Recursos	31/12/2018	



Ejecución Detallada de Actividades



Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018

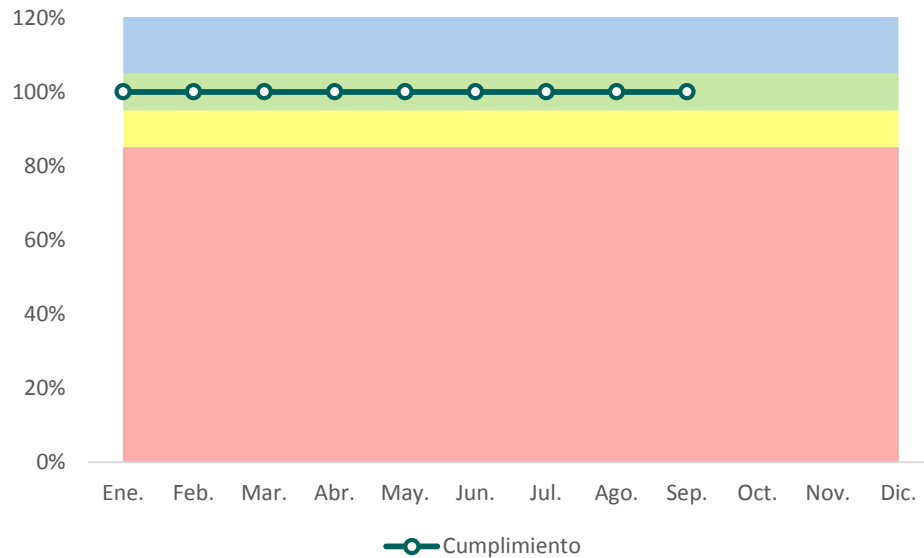

Análisis:

Al 30 de septiembre de 2018, se ha obtenido un cumplimiento acumulado del 100% lo que lo configura como una ejecución excelente, conforme a lo planeado por los diferentes procesos institucionales. No obstante, se han efectuado algunas actividades fuera del tiempo planeado.

Se destacan actividades tales como la formulación de la política anticorrupción y la actualización de la política de riesgos. (para mayor detalle ver anexo 1)

Convenciones



Actividad Completada en el tiempo y con el alcance planteado



Actividad completada fuera del tiempo planteado



Actividad rezagada



Detalle Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano





* Para detalle de cada Componente haga Clic en el Circulo correspondiente





Subcomponente: Política de Administración de Riesgos

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Revisar la política de administración de riesgos	Realizar una revisión de la política de administración de riesgos considerando: Versión 2 del MIPG , benchmarking con las entidades referentes en el tema y diferentes guías metodológicas.	Documento con propuestas de mejora para la política revisada	Gerente de Planeación	15/03/2018	
Actualizar la política de administración de riesgos	De acuerdo a la revisión realizada, ajustar la política buscando una articulación entre los diferentes tipos de riesgos en la entidad	Documento de política actualizada	Gerente de Planeación	30/04/2018	





Subcomponente: Construcción del mapa de riesgos de corrupción

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Revisar la metodología de administración de riesgos de corrupción en la entidad.	Realizar una revisión de la metodología actual de CISA para la administración de riesgos y proponer mejoras.	Documento con propuestas de mejora para la metodología revisada	Gerente de Planeación	15/03/2018	
Actualizar la metodología de administración de riesgos de corrupción	Realizar la actualización de la metodología buscando la articulación de la administración de riesgos de corrupción y otros tipos de riesgos que deben ser gestionados en la Entidad.	Documento con metodología actualizada	Gerente de Planeación	30/04/2018	
Actualizar el instrumento de levantamiento de riesgos	Con base en la actualización metodológica, actualizar el instrumento de levantamiento de la información de riesgos	Formato de levantamiento de riesgos actualizado	Gerente de Planeación	31/05/2018	
Capacitar a los procesos	Realizar capacitaciones a los procesos en el levantamiento de los riesgos de acuerdo con las directrices impartidas en la metodología	Listados de asistencia a capacitaciones	Gerente de Planeación	31/07/2018	








Subcomponente: Construcción del mapa de riesgos de corrupción

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Actualizar los riesgos	Generar un cronograma de trabajo con los procesos para efectuar el levantamiento de información para la actualización de los riesgos con los procesos de la entidad de acuerdo a la metodología actualizada	Formato de levantamiento de riesgos diligenciados	Gerente de Planeación Lideres de Procesos	15/10/2018	
Actualizar el mapa de riesgos	Con la información generada por todos los procesos, construir el mapa de riesgos de corrupción institucional	Mapa de riesgos documentado	Gerente de Planeación Lideres de Procesos	31/10/2018	






Subcomponente: Consulta y Divulgación

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Socializar la política de administración de riesgos	Socializar al interior y exterior de la entidad la política de administración de riesgos y ajustarla de acuerdo a las observaciones recibidas.	Política socializada	Gerente de Planeación	15/05/2018	
Socializar la metodología de administración de riesgos	Realizar una socialización al interior de la Entidad, principalmente con el equipo operativo para validar aspectos clave de la metodología realizada	Listado de asistencia de socialización de metodología	Gerente de Planeación	15/05/2018	
Publicar la política de administración de riesgos	Publicar en el sistema documental del sistema integrado de gestión la política ajustada. De igual manera, se publicará en la pagina web de la entidad.	Política publicada al interior y exterior de la entidad	Gerente de Planeación	30/06/2018	
Socializar el mapa de riesgos de la Entidad	Socializar al interior y exterior de la entidad el mapa de riesgos consolidado y ajustarlo de acuerdo a las observaciones recibidas.	Mapa de Riesgos socializado y ajustado	Gerente de Planeación	15/12/2018	
Publicar el mapa de riesgos	Publicar el mapa de riesgos al interior y exterior de la entidad.	Mapa de riesgos publicado	Gerente de Planeación	31/01/2019	





Subcomponente: Monitoreo y Revisión

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar el monitoreo de riesgos primer trimestre por parte de los Líderes de los procesos	Implementar las acciones de tratamiento definidas para los riesgos identificados en el plan y reportar sobre la gestión realizada y sobre eventuales materializaciones de riesgos.	Reporte de Gestión de Riesgos	Líderes de Procesos	30/04/2018	
Realizar el monitoreo de riesgos por parte de los Líderes de los procesos – 3	Implementar las acciones de tratamiento definidas para los riesgos identificados en el plan y reportar sobre la gestión realizada y sobre eventuales materializaciones de riesgos.	Reporte de Gestión de Riesgos	Líderes de Procesos	31/12/2018	







Subcomponente: Seguimiento

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Verificar la elaboración, visibilización y publicación del PAAC	Evaluar elaboración, visibilización y publicación del PAAC	Informe de verificación a la publicación del PAAC	Auditor Interno	18/05/2018	
Realizar seguimiento al PAAC conforme a la normatividad legal vigente para el primer cuatrimestre	Efectuar el Seguimiento y control a la implementación de las acciones de cada componente del PAAC	Informe de Seguimiento publicado	Auditor Interno	16/05/2018	
Realizar seguimiento al PAAC conforme a la normatividad legal vigente para el segundo cuatrimestre	Efectuar el Seguimiento y control a la implementación de las acciones de cada componente del PAAC	Informe de Seguimiento publicado	Auditor Interno	14/09/2018	
Realizar seguimiento al PAAC conforme a la normatividad legal vigente para el tercer cuatrimestre	Efectuar el Seguimiento y control a la implementación de las acciones de cada componente del PAAC	Informe de Seguimiento publicado	Auditor Interno	16/01/2019	







Subcomponente: Identificación de trámites

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Actualizar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos (OPAS)	Revisión de la información de CISA en el SUIIT	Acta de sesión de trabajo	Jefe Servicio Integral al Usuario - Jefe de Mejoramiento Continuo	16/01/2018	
Registrar o actualizar información de tramites y otros procedimientos administrativos en el SUIIT	Solicitar actualización en el SUIIT (si aplica)	Correo a DAFP (si aplica) Plataforma SUIIT	Jefe de Mejoramiento Continuo	31/01/2018	






Subcomponente: Priorización de trámites

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Revisar los trámites y otros procedimientos administrativos (OPAS) de CISA	Verificación de la normatividad interna y los datos del SUIT del DAFP	Clasificación de Trámites a racionalizar	Jefe Servicio Integral al Usuario - Jefe de Mejoramiento Continuo	31/01/2018	
Definir el trámite a racionalizar durante 2018	Con base en la métricas y la operación de CISA establecer el trámite a racionalizar	Trámite a racionalizar identificado	Jefe Servicio Integral al Usuario - Jefe de Mejoramiento Continuo	31/01/2018	





Subcomponente: Racionalización de trámites

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Formular estrategia de racionalización del trámite elegido	De acuerdo con la priorización realizada, establecer las acciones de racionalización administrativa	Cronograma de racionalización administrativa (en el formato SUII)	Jefe Servicio Integral al Usuario - Jefe de Mejoramiento Continuo	31/01/2018	
Implementar acciones de racionalización administrativa	Ejecutar el cronograma de racionalización establecido en el SUII	Cumplimiento de cronograma con evidencias	Jefe Servicio Integral al Usuario - Jefe de Mejoramiento Continuo	31/12/2018	







Subcomponente: Información de calidad y en lenguaje comprensible

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar análisis de solicitudes de información	Realizar un análisis de las solicitudes de información por lo menos con 2 años de anterioridad recibidas de las partes interesadas a través de la ventanilla de atención al usuario, e identificar temas de interés para la ciudadanía que no se encuentren publicados en la entidad	Informe presentado	Jefe Servicio Integral al Usuario	30/03/2018	
Optimizar el esquema de visualización de la pagina web para población en situación de discapacidad	Generar un mecanismo de fácil visualización y utilización que le permita a las personas con discapacidad poder visualizar el contenido de la entidad de una manera más fácil	Mecanismo definido en la web	Gerente de Planeación	30/04/2018	
Actualizar la matriz de comunicaciones	Tomando como insumo la ley de transparencia y analizando con todas las áreas internas de la entidad originadores de la información, actualizar la matriz de comunicaciones como instrumento que permite hacer seguimiento a las publicaciones de CISA	Matriz de comunicaciones actualizada	Jefe de Comunicaciones	30/06/2018	





Subcomponente: Información de calidad y en lenguaje comprensible

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Permitir audio en algunas secciones de la pagina web	Permitir a los usuarios en condición de discapacidad escuchar los textos generados en la opción ¿Qué hacemos? De la pagina web de CISA	Pagina ¿qué Hacemos? Actualizada	Gerente de Planeación	30/09/2018	
Revisar al cumplimiento de la matriz de comunicaciones 3 Trimestre	Con base en la actualización de la matriz de comunicaciones, revisar el cumplimiento a la actualización de los documentos descritos en la matriz de comunicaciones de la Entidad con el fin de garantizar que la información es oportuna y se encuentra disponible	Informe presentado	Gerente de Planeación	30/09/2018	
Revisar al cumplimiento de la matriz de comunicaciones 4 Trimestre	Con base en la actualización de la matriz de comunicaciones, revisar el cumplimiento a la actualización de los documentos descritos en la matriz de comunicaciones de la Entidad con el fin de garantizar que la información es oportuna y se encuentra disponible	Informe presentado	Gerente de Planeación	15/12/2018	
Actualizar la metodología para la caracterización de los grupos de interés de CISA	Con base en la documentación actual, realizar una revisión de su alcance, y actualizarla si es el caso, de manera que se estandaricen los ejercicios de caracterización de grupos de interés en cuanto a sus responsabilidades, mantenimiento, divulgación y retroalimentación por parte de los áreas de la Entidad.	Metodología para la caracterización de grupos de interés actualizada	Gerente de Proyectos	31/12/2018	





Subcomponente: Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Definir mecanismo para la audiencia pública de rendición de cuentas	Analizar alternativas para llevar a cabo el ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas y seleccionar la más adecuada para la Entidad.	Esquema definido	Gerente de Planeación	30/04/2018	
Rediseñar intranet de acuerdo a la encuesta de percepción y análisis desarrollados	Rediseñar la intranet de acuerdo a los análisis y encuestas efectuadas con el fin de potencializarla como un medio de comunicación efectivo al interior de la entidad.	Intranet rediseñada	Jefe de Comunicaciones	01/04/2018	
Generar videos informando la gestión de la Entidad 1 Semestre	Generar por lo menos 2 videos cortos por parte del presidente de la Entidad en los cuales se informen los principales resultados y los retos a los cuales nos enfrentamos	Videos publicados en la pagina web	Jefe de Comunicaciones	30/06/2018	
Realizar encuesta de sobre la información presentada	Posterior a la publicación de los videos, realizar una encuesta entre los participantes sobre la percepción de la utilidad de la información presentada	Encuesta realizada	Gerente de Planeación	30/06/2018	
Participar en la Rendición de Cuentas Sectorial	Participar en la Rendición de Cuentas Sectorial organizada por el Ministerio de Hacienda y enviar la información de acuerdo a los requerimientos solicitados	Participación efectuada	Presidente	31/12/2018	





Subcomponente: Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar foro temático	sobre un tema de importancia en la entidad basados en las necesidades e intereses de los grupos de valor	Foro realizado	Gerente de Planeación	31/07/2018	
Realizar o participar en ejercicio de innovación abierta	DE acuerdo a las necesidades de la Entidad, realizar un ejercicio de innovación abierta sobre una temática en particular o participar de los ejercicios efectuados por el Ministerio de Hacienda en su rol de cabeza de sector	Ejercicio de participación realizado	Gerente de Planeación	31/07/2018	
Organizar audiencia pública de rendición de cuentas	De acuerdo al mecanismo definido, organizar la información correspondiente, definir el sitio, hora, Diseñar y enviar invitaciones así como las demás actividades necesarias para su correcta implementación	Audiencia pública realizada	Gerente de Planeación	31/10/2018	
Construir ecosistema virtual de participación ciudadana	Construir un ecosistema virtual de participación ciudadana a través del portal web CISA y promover/divulgar dichos mecanismos para incentivar la participación frente a los temas de interés de CISA y su portafolio de servicios.	Ecosistema virtual implementado	Gerente de Tecnología	31/10/2018	







Subcomponente: Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Potencializar las redes sociales para un dialogo constante con las partes interesadas	Abrir espacios de comunicación con las partes interesadas a través de las redes sociales como sistema de dialogo en doble vía sobre temas de interés	Nuevos espacios generados por medio de las redes sociales	Jefe de Comunicaciones	01/12/2018	
Generar espacios de interacción con la alta dirección	Generar espacios en los cuales la alta dirección de a conocer su gestión a los colaboradores sobre los principales retos y logros de la Entidad	Medios de Comunicación	Jefe de Comunicaciones	02/12/2018	
Generar videos informando la gestión de la Entidad 2 Semestre	Generar por lo menos 2 videos cortos por parte del presidente de la Entidad en los cuales se informen los principales resultados y los retos a los cuales nos enfrentamos	Videos publicados en la pagina web	Jefe de Comunicaciones	31/12/2018	
Efectuar convocatoria e Intervención Ciudadana a Nuestra Planeación institucional	Realizar la convocatoria así como el mecanismos para la participación de las partes interesadas sobre la formulación de los diferentes planes de acción a desarrollar en la vigencia 2019	Mecanismo y difusión elaborados	Gerente de Planeación	31/12/2018	







Subcomponente: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Publicar campañas internas sobre rendición de cuentas	Publicar en los diferentes medios internos, la importancia de dar y pedir información de interés para la ciudadanía en el marco de servidores públicos	Campañas internas publicadas	Gerencia de Planeación	30/06/2018	
Diseñar juego de sensibilización sobre rendición de cuentas	Elaborar un juego interactivo, en el cual los servidores y/o la ciudadanía puedan probar sus conocimientos acerca del proceso de Rendición de Cuentas.	Juego publicado	Gerencia de Planeación	30/09/2018	





Subcomponente: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar encuesta sobre la usabilidad y percepción de la intranet	Al interior de la entidad, realizar una encuesta que permita identificar debilidades y fortalezas de la actual intranet. Con base en ello se establecerá un posible rediseño de la misma	Encuesta realizada sobre la intranet	Jefe de Comunicaciones	01/04/2018	
Realizar encuesta sobre la percepción de la pagina web	Realizar una encuesta sobre al percepción de la claridad de la pagina web como instrumento para la consulta de información por las partes interesadas. Con base en ello se establecerá un posible rediseño de la misma	Encuesta realizada sobre la web	Jefe de Comunicaciones	01/07/2018	
Analizar resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Analizar los resultados obtenidos de acuerdo a la participación en las actividades y visualización de información por las partes interesadas	Informe de resultados	Gerente de Planeación	31/12/2018	



MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



Subcomponente: Estructura administrativa y direccionamiento


Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de Servicio Integral al Usuario y la Alta Dirección	Generar espacios por medio de los cuales se pueda establecer una comunicación directa entre el SIU y las áreas involucradas en las encuestas de satisfacción realizadas.	Presentar informe a las áreas relacionadas de las oportunidades de mejora solicitadas por los clientes.	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/02/2018	
Implementar el nuevo esquema de servicio integral al usuario	Generar el nuevo esquema de servicio integral al usuario	Esquema Implementado	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/03/2018	
Informar a las áreas oportunidades de mejora. Bimestre 1	De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, generar un informe para presentar a las áreas involucradas como parte integral de sus esquemas de mejoramiento continuo	Informe presentado	Jefe Servicio Integral al Usuario	31/03/2018	
Informar a las áreas oportunidades de mejora. Bimestre 2	De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, generar un informe para presentar a las áreas involucradas como parte integral de sus esquemas de mejoramiento continuo	Informe presentado	Jefe Servicio Integral al Usuario	31/05/2018	
Informar a las áreas oportunidades de mejora. Bimestre 3	De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, generar un informe para presentar a las áreas involucradas como parte integral de sus esquemas de mejoramiento continuo	Informe presentado	Jefe Servicio Integral al Usuario	31/07/2018	



MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



Subcomponente: Estructura administrativa y direccionamiento

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Informar a las áreas oportunidades de mejora. Bimestre 4	De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, generar un informe para presentar a las áreas involucradas como parte integral de sus esquemas de mejoramiento continuo	Informe presentado	Jefe Servicio Integral al Usuario	30/09/2018	
Informar a las áreas oportunidades de mejora. Bimestre 5	De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, generar un informe para presentar a las áreas involucradas como parte integral de sus esquemas de mejoramiento continuo	Informe presentado	Jefe Servicio Integral al Usuario	30/11/2018	
Informar a las áreas oportunidades de mejora. Bimestre 6	De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, generar un informe para presentar a las áreas involucradas como parte integral de sus esquemas de mejoramiento continuo	Informe presentado	Jefe Servicio Integral al Usuario	31/01/2019	



MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



Subcomponente: Fortalecimiento de los canales de atención

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Estudiar mecanismos para actualizar radicación de PQR por la pagina web.	Solicitar a la PMO la actualización de la radicación de PQRS en la pagina web y pertinencia de incluirlo en la nueva APP.	Método de radicación actualizado	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/06/2018	
Revisar los protocolos de servicio	Actualización permanente de los protocolos de atención y de respuestas cada vez que se presenten cambios en las carteras	Protocolos actualizados	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/06/2018	
Actualizar información en la página web en los temas de servicio Integral al Usuario	Actualización permanente de la información de la página web cada vez que se presenten cambios	Información actualizada	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/06/2018	
Actualizar el servicio de generación de paz y salvos por la pagina web	Solicitar a la PMO la actualización de la descarga de paz y salvos por la pagina web.	Servicio actualizado	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/06/2018	
Rediseñar el landing page de vitrina inmobiliaria y cartera en la página web de CISA	A través de las mejoras a realizar en la página web, garantizar la responsividad de la misma para mejorar la experiencia de los usuarios a través de teléfonos inteligentes	Landing page de vitrina inmobiliaria y cartera en producción	Gerente de Tecnología	15/10/2018	



MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



Subcomponente: Talento humano

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Actualizar las competencias de servicio al ciudadano con los cursos ofrecidos por el PNSC -DNP.	Participación permanente en cursos del PNSC - DNP y transferir conocimiento al tercero	Cursos realizados	Jefe Servicio Integral al Usuario	30/12/2018	



MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



Subcomponente: Normativo y procedimental

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Proponer temas de servicio al ciudadano para divulgar por las redes sociales Trimestre 1	Generar temas de interés para el ciudadano que puedan ser publicados en las diferentes redes sociales de la entidad.	Divulgación de temas relacionados	Jefe Servicio Integral al Usuario	31/03/2018	
Sensibilizar en temas de gestión de PQRD. Trimestre 1	Sensibilizar en temas de gestión de PQRDS a los funcionarios de las distintas áreas y aliados estratégicos relacionados con la atención de las mismas.	Sensibilizaciones realizadas	Jefe Servicio Integral al Usuario	31/03/2018	
Actualizar la Circular 005	Actualizar la Circular 005 según las necesidades del proceso	Circular 005 revisada semestralmente	Jefe Servicio Integral al Usuario	30/06/2018	
Proponer temas de servicio al ciudadano para divulgar por las redes sociales Trimestre 2	Generar temas de interés para el ciudadano que puedan ser publicados en las diferentes redes sociales de la entidad.	Divulgación de temas relacionados	Jefe Servicio Integral al Usuario	30/06/2018	
Sensibilizar en temas de gestión de PQRDS. Trimestre 2	Sensibilizar en temas de gestión de PQRDS a los funcionarios de las distintas áreas y aliados estratégicos relacionados con la atención de las mismas.	Sensibilizaciones realizadas	Jefe Servicio Integral al Usuario	30/06/2018	



MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



Subcomponente: Normativo y procedimental



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Proponer temas de servicio al ciudadano para divulgar por las redes sociales Trimestre 3	Generar temas de interés para el ciudadano que puedan ser publicados en las diferentes redes sociales de la entidad.	Divulgación de temas relacionados	Jefe Servicio Integral al Usuario	30/09/2018	
Sensibilizar en temas de gestión de PQRDS. Trimestre 3	Sensibilizar en temas de gestión de PQRDS a los funcionarios de las distintas áreas y aliados estratégicos relacionados con la atención de las mismas.	Sensibilizaciones realizadas	Jefe Servicio Integral al Usuario	30/09/2018	
Sensibilizar en temas de gestión de PQRDS. Trimestre 4	Sensibilizar en temas de gestión de PQRDS a los funcionarios de las distintas áreas y aliados estratégicos relacionados con la atención de las mismas.	Sensibilizaciones realizadas	Jefe Servicio Integral al Usuario	31/12/2018	
Proponer temas de servicio al ciudadano para divulgar por las redes sociales Trimestre 4	Generar temas de interés para el ciudadano que puedan ser publicados en las diferentes redes sociales de la entidad.	Divulgación de temas relacionados	Jefe Servicio Integral al Usuario	31/12/2018	
Actualizar los flujos del aplicativo ZEUS en los correspondiente a gestión de las PQRSD	Actualizar los flujos del aplicativo de gestión de las PQRSD según la necesidad del proceso	Aplicativo de Gestión actualizado	Jefe Servicio Integral al Usuario	30/12/2018	



MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



Subcomponente: Relacionamiento con el ciudadano

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Elaborar informe para el nivel directivo de oportunidades de mejora de los encuestados Semestre 1	Generar informes que le permitan conocer al nivel directivo las principales oportunidades de mejora de acuerdo a la percepción de los usuarios externos	Informe realizado	Jefatura Servicio Integral al Usuario	30/06/2018	
Elaborar informe para el nivel directivo de atención en sucursales Semestre 1	Generar informes que le permitan conocer al nivel directivo de las sucursales las principales oportunidades de mejora de acuerdo a la percepción de los usuarios externos	Informe realizado	Jefatura Servicio Integral al Usuario	30/06/2018	
Elaborar informe para el nivel directivo de oportunidades de mejora de los encuestados Semestre 2	Generar informes que le permitan conocer al nivel directivo las principales oportunidades de mejora de acuerdo a la percepción de los usuarios externos	Informe realizado	Jefatura Servicio Integral al Usuario	31/12/2018	
Elaborar informe para el nivel directivo de atención en sucursales Semestre 2	Generar informes que le permitan conocer al nivel directivo de las sucursales las principales oportunidades de mejora de acuerdo a la percepción de los usuarios externos	Informe realizado	Jefatura Servicio Integral al Usuario	31/12/2018	
Aplicar encuesta post venta y visitas a inmuebles para la Vicepresidencia de Negocios	Aplicar mensualmente la encuesta de satisfacción por los servicios prestados y productos ofrecidos a través de la Vicepresidencia de Negocios	Encuesta mensual realizada	Jefatura Servicio Integral al Usuario	30/12/2018	



MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



Subcomponente: Lineamientos de transparencia activa

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar análisis de solicitudes de información	Realizar un análisis de las solicitudes de información por lo menos con 2 años de anterioridad recibidas de las partes interesadas a través de la ventanilla de atención al usuario, e identificar temas de interés para la ciudadanía que no se encuentren publicados en la entidad	Informe presentado	Jefe Servicio Integral al Usuario	30/03/2018	
Actualizar la matriz de comunicaciones	Tomando como insumo la ley de transparencia y analizando con todas las áreas internas de la entidad originadores de la información, actualizar la matriz de comunicaciones como instrumento que permite hacer seguimiento a las publicaciones de CISA	Matriz de comunicaciones actualizada	Jefe de Comunicaciones	30/06/2018	
Realizar encuesta sobre la percepción de la pagina web	Realizar una encuesta sobre al percepción de la claridad de la pagina web como instrumento para la consulta de información por las partes interesadas. Con base en ello se establecerá un posible rediseño de la misma	Encuesta realizada sobre la web	Jefe de Comunicaciones	01/07/2018	
Revisar al cumplimiento de la matriz de comunicaciones 3 Trimestre	Con base en la actualización de la matriz de comunicaciones, revisar el cumplimiento a la actualización de los documentos descritos en la matriz de comunicaciones de la Entidad con el fin de garantizar que la información es oportuna y se encuentra disponible	Informe presentado	Gerente de Planeación	30/09/2018	



MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



Subcomponente: Lineamientos de transparencia activa




Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Revisar al cumplimiento de la matriz de comunicaciones 4 Trimestre	Con base en la actualización de la matriz de comunicaciones, revisar el cumplimiento a la actualización de los documentos descritos en la matriz de comunicaciones de la Entidad con el fin de garantizar que la información es oportuna y se encuentra disponible	Informe presentado	Gerente de Planeación	15/12/2018	



MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



Subcomponente: Lineamientos de transparencia pasiva

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Informar la gestión al CIGD. Trimestre 1	Informar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el estado de las respuestas a las PQRS allegadas a la Entidad, con el fin de tomar acciones necesarias	Informe presentado	Jefe Servicio Integral al Usuario	30/04/2018	
Fortalecer el seguimiento y monitoreo a las solicitudes	Realizar un análisis de la circular para la atención a PQRS y fortalecer aquellos apartados en los que es necesario endurecer los protocolos para las respuestas oportunas por parte de las áreas.	Documento actualizado y publicado	Jefe Servicio Integral al Usuario	30/06/2018	
Informar la gestión al CIGD. Trimestre 2	Informar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el estado de las respuestas a las PQRS allegadas a la Entidad, con el fin de tomar acciones necesarias	Informe presentado	Jefe Servicio Integral al Usuario	31/07/2018	
Informar la gestión al CIGD. Trimestre 3	Informar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el estado de las respuestas a las PQRS allegadas a la Entidad, con el fin de tomar acciones necesarias	Informe presentado	Jefe Servicio Integral al Usuario	31/10/2018	
Informar la gestión al CIGD. Trimestre 4	Informar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el estado de las respuestas a las PQRS allegadas a la Entidad, con el fin de tomar acciones necesarias	Informe presentado	Jefe Servicio Integral al Usuario	31/01/2019	



MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



Subcomponente: Lineamientos de transparencia pasiva

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Capacitar en PQRS	Realizar una capacitación presencial o virtual a los actores de la Entidad en lo correspondiente a Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias	Capacitación realizada - Listados de asistencia o imágenes de publicaciones realizadas	Jefe Servicio Integral al Usuario	30/12/2018	
Incorporar en el proceso de inducción tema sobre PQRS	Incorporar en el proceso de inducción un espacio que le permita a servicio integral al usuario dar a conocer la importancia de dar respuesta oportuna y verazmente a las PQRS allegadas a la Entidad	Temas de inducción actualizados	Jefe Servicio Integral al Usuario	30/12/2018	



MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



Subcomponente: Elaboración de los instrumentos de gestión de la información

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Elaborar el Sistema Integrado de Conservación	Establecer los lineamientos para la conservación de los documentos en sus diferentes soportes, desde el momento de su emisión, período de vigencia, hasta su disposición final. Los lineamientos deben ser presentados y aprobados por el Comité de PDA, y publicados en la página web	Documento de SIC elaborado y publicado	Gerente de Recursos	28/02/2018	
Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de información	Con base en la actualización de las Tablas de Retención Documental, realizar la actualización del registro o inventario de activos de información.	Registro o inventario de activos de información actualizado y publicado	Gerente de Recursos	04/06/2018	
Actualizar la tabla de información confidencial y reservada	Actualizar la tabla de información confidencial y reservada, de acuerdo a la actualización de las Tablas de Retención Documental y considerando los requerimientos de ley	Tabla de información confidencial y reservada actualizada y publicada	Gerente de Recursos	04/07/2018	
Elaborar el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo	Definir los lineamientos para la producción, conservación y disposición de los documentos electrónicos de archivo de CISA	Documento Programa de gestión de Documentos Electrónicos de Archivo elaborado	Gerente de Recursos	30/09/2018	
Actualizar las Tablas de Retención Documental	Actualizar las Tablas de Retención Documental, de acuerdo a las últimas modificaciones de estructura organizacional y procesos generados en la entidad.	TRD actualizadas y publicadas	Gerente de Recursos	05/10/2018	



MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



Subcomponente: Elaboración de los instrumentos de gestión de la información



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Elaborar las Tablas de Valoración Documental	Diseñar la herramienta archivística que permitirá aplicar el proceso de organización documental al fondo documental acumulado de CISA.	TVD elaboradas y publicadas	Gerente de Recursos	15/01/2019	



MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



Subcomponente: Criterio diferencial de accesibilidad

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Optimizar el esquema de visualización de la página web para población en situación de discapacidad	Generar un mecanismo de fácil visualización y utilización que le permita a las personas con discapacidad poder visualizar el contenido de la entidad de una manera más fácil	Mecanismo definido en la web	Gerente de Planeación	30/04/2018	
Permitir audio en algunas secciones de la página web	Permitir a los usuarios en condición de discapacidad escuchar los textos generados en la opción ¿Qué hacemos? De la página web de CISA	Página ¿qué Hacemos? Actualizada	Gerente de Planeación	30/09/2018	
Realizar mantenimiento a las instalaciones	Realizar el mantenimiento al esquema de accesibilidad a espacios físicos para población en condición de discapacidad generados en la vigencia 2017 con el fin de garantizar su óptimo funcionamiento	Informe de mantenimiento	Gerente de Recursos	31/12/2018	



MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



Subcomponente: Monitoreo del acceso a la información pública

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Revisar y optimizar el informe de PQRS	Revisar y optimizar el informe de PQRS con el fin de buscar que la información se presente de la manera más completa posible.	Informe optimizado	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/03/2018	
Publicar informe de solicitudes Trimestre 1	Publicar el informe con la información de las solicitudes allegadas a CISA de acuerdo al proceso de revisión y optimización del mismo	Informe publicado	Jefe Servicio Integral al Usuario	30/04/2018	
Revisar y optimizar el Informe de solicitudes de acceso	Revisar y optimizar el informe de solicitudes de acceso a la información con el fin de buscar que la información se presente de la manera más clara y concreta posible.	Informe Optimizado	Jefe Servicio Integral al Usuario	30/06/2018	
Publicar informe de solicitudes Trimestre 2	Publicar el informe con la información de las solicitudes allegadas a CISA de acuerdo al proceso de revisión y optimización del mismo	Informe publicado	Jefe Servicio Integral al Usuario	31/07/2018	
Publicar informe de solicitudes Trimestre 3	Publicar el informe con la información de las solicitudes allegadas a CISA de acuerdo al proceso de revisión y optimización del mismo	Informe publicado	Jefe Servicio Integral al Usuario	31/10/2018	
Publicar informe de solicitudes Trimestre 4	Publicar el informe con la información de las solicitudes allegadas a CISA de acuerdo al proceso de revisión y optimización del mismo	Informe publicado	Jefe Servicio Integral al Usuario	31/01/2019	





Subcomponente: N.A

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Formular la política Anticorrupción	Realizar un análisis de buenas prácticas en la definición de políticas anticorrupción y con base en ello formular y aprobar la política	Política definida y aprobada	Gerente de Planeación	30/04/2018	
Actualizar los valores corporativos	Realizar un análisis de los valores corporativos definidos en el código de integridad del DAFP para las entidades estatales y realizar la actualización correspondiente para CISA	Valores corporativos actualizados	Gerente de Recursos	31/05/2018	
Formular la política de DDHH	Realizar un análisis de buenas prácticas en la definición de políticas de DDHH y con base en ello formular y aprobar la política	Política definida y aprobada	Vicepresidente jurídica	29/06/2018	
Optimizar esquema de denuncias de corrupción	Formalizar el procedimiento para la atención de las denuncias de actos de corrupción recibidos a través de los diferentes canales de atención	Documentos actualizados y publicados	Jefe de Mejoramiento Continuo	30/06/2018	
Diseñar e implementar mecanismo para atender solicitudes que afecten los DDHH	Diseñar un mecanismo para la atención a las solicitudes que afecten los DDH y modificar la normatividad interna que se vea afectada. Del mismo modo, divulgar las modificaciones y mecanismos efectuados	Mecanismo Implementado - Actualización Circular	Jefe Servicio Integral al Usuario	31/07/2018	



OTRAS INICIATIVAS



Subcomponente: N.A


Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar la auditoría de renovación de certificación ISO 14001	Preparar a la entidad y realizar las gestiones correspondientes orientadas a la renovación de la certificación ISO 14001.	Certificación ISO 14001	Jefe de Mejoramiento Continuo	30/09/2017	
Revisar manual EFR	Realizar la revisión del manual EFR y alinearlos con los lineamientos impartidos en la política generada	Manual EFR actualizado	Gerente de Recursos	30/09/2018	
Difundir la política de DDHH al interior de CISA	Generar campañas internas de difusión de la política de DDHH	Campañas Implementadas	Gerente de Recursos	30/11/2018	
Difundir la política de DDHH al exterior de CISA	Generar campañas externas de difusión de la política de DDHH	Campañas Implementadas	Jefe de Comunicaciones	30/11/2018	
Socializar los valores	Realizar campañas al interior de la organización o socializar por medio del plan de capacitación la actualización de los valores corporativos en concordancia con el código de integridad	Difusión y sensibilización de los valores corporativos	Gerente de Recursos	30/11/2018	
Difundir la política Anticorrupción	Generar campañas internas y externas de difusión de la política Anticorrupción	Campañas Implementadas	Gerente de Planeación	30/11/2018	



Ejecución Detallada de Actividades



Plan Estratégico Sectorial 2018

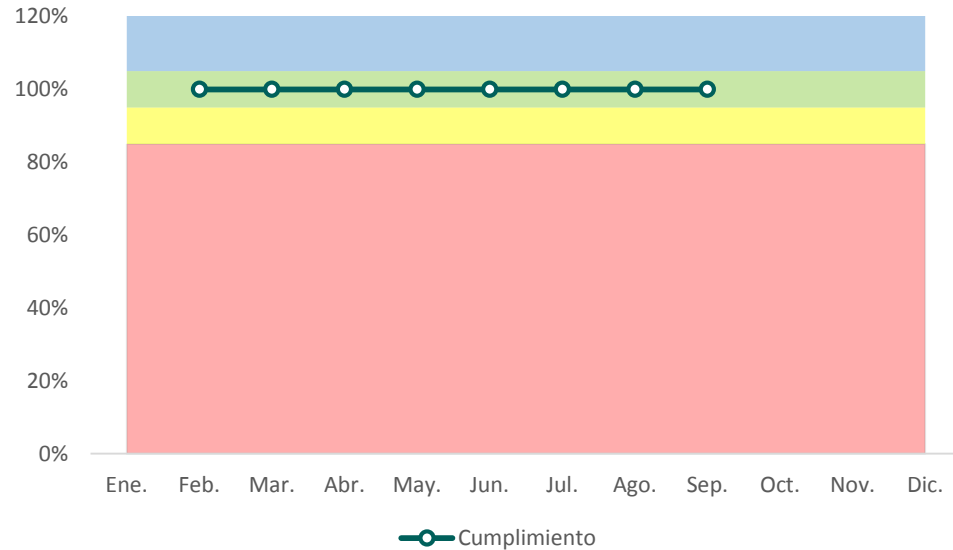

Análisis:

Al 30 de septiembre de 2018, se ha obtenido un cumplimiento acumulado de 100% lo que lo configura como una ejecución excelente, conforme a lo planeado por los diferentes procesos institucionales. Se destacan actividades tales como la formulación de la política anticorrupción y la elaboración del Sistema Integrado de Conservación. (para mayor detalle ver anexo 1)

Convenciones



Actividad Completada en el tiempo y con el alcance planteado




Actividad completada fuera del tiempo planteado



Actividad rezagada



Detalle Plan Estratégico Sectorial




* Para detalle de acciones en cada Política haga Clic en el Circulo correspondiente





Estrategia: Mejorar el Ambiente y Condiciones Laborales



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Actualizar los valores corporativos	Realizar un análisis de los valores corporativos definidos en el código de integridad del DAFP para las entidades estatales y realizar la actualización correspondiente para CISA	Valores corporativos actualizados	Gerente de Recursos	31/05/2018	
Socializar los valores	Realizar campañas al interior de la organización o socializar por medio del plan de capacitación la actualización de los valores corporativos en concordancia con el código de integridad	Valores socializados	Gerente de Recursos	30/11/2018	



TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN



Estrategia: Constituir e implementar el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Optimizar el esquema de visualización de la página web para población en situación de discapacidad	Generar un mecanismo de fácil visualización y utilización que le permita a las personas con discapacidad poder visualizar el contenido de la entidad de una manera más fácil	Esquema de visualización optimizado	Gerente de Planeación	30/04/2018	
Formular la política Anticorrupción	Realizar un análisis de buenas prácticas en la definición de políticas anticorrupción y con base en ello formular y aprobar la política	Política anticorrupción formulada	Gerente de Planeación	30/04/2018	
Participar en el día de la transparencia	Participación y asistencia a la jornada programada para la celebración del día de la transparencia	Participación efectuada	Gerente de Planeación	30/11/2018	



FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS



Estrategia: Racionalización de Trámites y/o Procedimientos

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar diagnóstico para implementación del MIPG II	Elaboración de un diagnóstico institucional del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión al sistema de gestión institucional con base en las herramientas de autodiagnósticos de la Función Pública y los resultados del FURAG, según aplique a la entidad.	Diagnostico realizado	Gerente de Planeación	31/05/2018	
Optimizar esquema de denuncias de corrupción	Formalizar el procedimiento para la atención de las denuncias de actos de corrupción recibidos a través de los diferentes canales de atención	Esquema optimizado	Jefe de Mejoramiento Continuo	30/06/2018	





Estrategia: Servicio al Ciudadano

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Implementar el nuevo esquema de servicio integral al usuario	Generar el nuevo esquema de servicio integral al usuario.	Nuevo esquema implementado	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/03/2018	
Estudiar mecanismos para actualizar radicación de PQR por la pagina web.	Solicitar a la PMO la actualización de la radicación de PQRS en la pagina web y pertinencia de incluirlo en la nueva APP.	Mecanismo estudiado	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/06/2018	
Actualizar el servicio de generación de paz y salvos por la pagina web	Solicitar a la PMO la actualización de la descarga de paz y salvos por la pagina web.	Servicio actualizado	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/06/2018	





Estrategia: Racionalización de Trámites y/o Procedimientos

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Elaborar el Sistema Integrado de Conservación	Establecer los lineamientos para la conservación de los documentos en sus diferentes soportes, desde el momento de su emisión, período de vigencia, hasta su disposición final. Los lineamientos deben ser presentados y aprobados por el Comité de PDA, y publicados en la página web	Sistema Integrado de Conservación Elaborado	Gerente de Recursos	28/02/2018	
Actualizar las Tablas de Retención Documental	Actualizar las Tablas de Retención Documental, de acuerdo a las últimas modificaciones de estructura organizacional y procesos generados en la entidad.	Tablas de retención documental actualizadas	Gerente de Recursos	04/06/2018	
Elaborar el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo	Definir los lineamientos para la producción, conservación y disposición de los documentos electrónicos de archivo de CISA	Programa de gestión de documentos electrónicos elaborado	Gerente de Recursos	30/09/2018	
Elaborar las Tablas de Valoración Documental	Diseñar la herramienta archivística que permitirá aplicar el proceso de organización documental al fondo documental acumulado de CISA.	Tablas de valoración documental actualizadas	Gerente de Recursos	31/12/2018	








Estrategia: Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno en Línea

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Implementar Tablero de Control de TI	Implementar tablero de control que garantiza la medición de adopción de los procesos, servicios y capacidades de TI	Tablero de control implementado	Gerente de Tecnología	30/07/2018	
Generar el Mapa de Procedimientos para la Gestión de TI en CISA	Transformar la Circular Normativa CN93 (Gestión de Infraestructura Tecnológica) en un mapa de procedimientos tácticos, operativos y estratégicos de TI acorde al Gobierno Tecnológico, su realidad operacional y alineación a la estrategia de la Entidad	Mapa de procedimientos generados	Gerente de Tecnología	30/08/2018	
Construir y divulgar el Catálogo de Servicios de TI	Construir y Divulgar el catálogo de servicios de TI, suscribiendo los SLAs, OLAs y UC que apliquen.	Catalogo de servicios construido y difundido	Gerente de Tecnología	30/08/2018	
Construir ecosistema virtual de participación ciudadana	Construir un ecosistema virtual de participación ciudadana a través del portal web CISA y promover/divulgar dichos mecanismos para incentivar la participación frente a los temas de interés de CISA y su portafolio de servicios.	Ecosistema virtual implementado	Gerente de Tecnología	31/10/2018	





Estrategia: Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno en Línea


Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar el análisis de Riesgos de Seguridad de la Información	Realizar el análisis de riesgos para los procesos: 1. Comunicación Corporativa 2. Soluciones Para el Estado 3. Gestión Integral de Activos 4. Gestión Jurídica del Negocio 5. Gestión Integral de Servicios 6. Servicio Integral al usuario	Análisis de riesgos realizado	Oficial de Seguridad de la información	30/04/2018	
Generar Plan de Acción para tratamiento de riesgos de seguridad de la información	Generar el plan de acción de acuerdo al análisis de riesgos para los procesos: 1. Comunicación Corporativa 2. Soluciones Para el Estado 3. Gestión Integral de Activos 4. Gestión Jurídica del Negocio 5. Gestión Integral de Servicios 6. Servicio Integral al usuario	Plan de acción generado	Oficial de Seguridad de la información	30/05/2018	
Ejecutar pruebas de ingeniería social	Identificar vulnerabilidades en el componente humano en lo referente al nivel conciencia y educación en seguridad de la información	Pruebas ejecutadas	Oficial de Seguridad de la información	30/08/2018	



Ejecución Detallada de Actividades



Plan de Mejoramiento Contraloría 2018

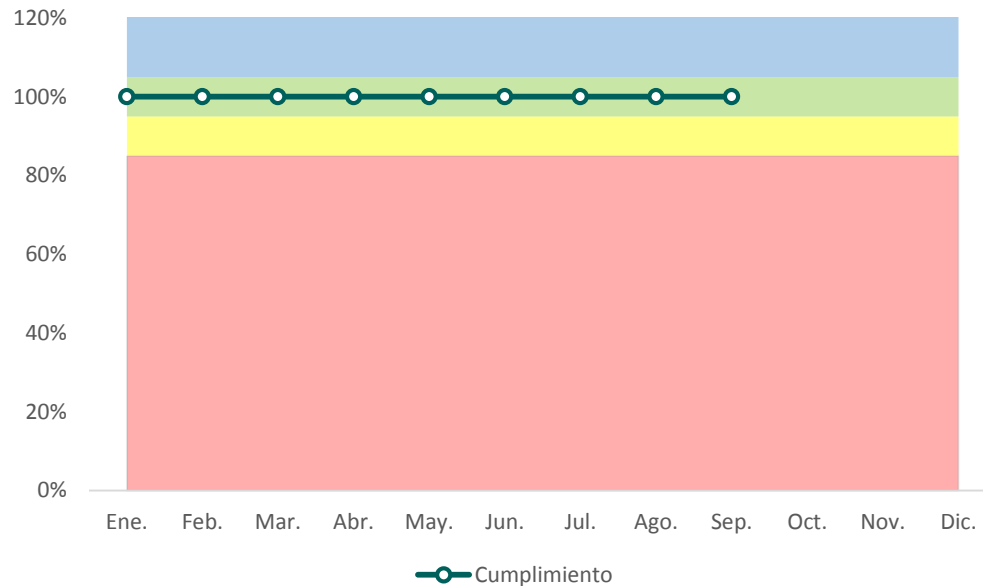

Análisis:

Al 30 de septiembre de 2018, se ha obtenido un cumplimiento acumulado de 100% lo que lo configura como una ejecución excelente, conforme a lo planeado por los diferentes procesos institucionales.

Se destaca la actividad de modificación de políticas internas para la realización de avalúos, la automatización de reportes y la elaboración de manuales técnicos y de usuario para las aplicaciones institucionales. (para mayor detalle ver anexo 1)

Convenciones



Actividad Completada en el tiempo y con el alcance planteado



Actividad completada fuera del tiempo planteado



Actividad rezagada



Detalle Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República



* Para detalle de las acciones cada Auditoria haga Clic en el Circulo correspondiente



HALLAZGOS PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN



Auditorías Vigencias Anteriores Febrero 2014	
Hallazgo	Nombre
H15-Feb 14	Aplicativos
H18-Feb 14	Cuenta Deudores
H26-Feb 14	Avaluó de Inmuebles

Auditorías Vigencias Anteriores Junio 2014	
Hallazgo	Nombre
H2-Jun 14	Consolidación Plan de Mejoramiento
H9-Jun 14	Inventario Final Inmuebles
H13-Jun 14	Ejecución Presupuestal

Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016	
Hallazgo	Nombre
H1.1-Dic 17	Inmuebles registrados en los Inventarios cuyo titular no es CISA.
H1.2-Dic 17	Inmuebles cuyo titular es CISA, pero no se encuentran registrados en Estados Financieros
H1.3-Dic 17	Diferencias en los registros de Información del inventario de Inmuebles.
H1.4-Dic 17	Inmuebles Registrados en el Inventario sin valor de Avaluó.
H2-Dic 17	Registro contable SOFTWARE
H3-Dic 17	Partidas por Identificar
H4-Dic 17	Reporte SIRECI

* Para detalle de las acciones de mejoramiento para cada Hallazgo haga Clic en el nombre del Hallazgo correspondiente



Aplicativos



Código	H15Feb14
Hallazgo	En los aplicativos desarrollados por CISA, conforme con lo establecido en la Circular 093, se debe incluir además del código fuente del aplicativo, la documentación correspondiente al manual técnico y al manual de usuario. Sin embargo, se observa que para los aplicativos COBRA, GESCAM, CONCISA, NUEVOSIGEP no se cuenta con la mencionada documentación
Causa	Lo anterior evidencia riesgos relacionados con la operación y funcionamiento de los aplicativos ya que estos son vulnerables cuando no son utilizados de forma adecuada por los usuarios y no cuentan con controles automáticos que obliguen al usuario a realizar acciones como adjuntar los soportes para operaciones críticas como el caso de los registros de pagos
Responsable Actividades	Sergio Moreno – Gerente de Tecnología

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Elaborar manuales técnico y de usuario para la aplicación COBRA	Manuales Documentados	2	30/04/2018	
Elaborar manuales técnicos y de usuario para las aplicaciones SIGEP y GESCAM	Manuales Documentados	4	30/06/2018	
Elaborar manuales técnicos y de usuario para las aplicaciones ZEUS y SIGA	Manuales Documentados	4	31/08/2018	





Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Elaborar manual técnico y de usuario para la aplicación OLYMPUS	Manuales Documentados	2	30/11/2018	
Actualizar los manuales técnicos y de usuario para las aplicaciones CONCISA, TEMIS e IMC	Manuales Documentados	6	30/01/2019	
Actualizar el repositorio documental con los manuales actualizados y divulgar a los usuarios de CISA y Terceros las nuevas versiones para su uso.	Registro de divulgación de los manuales de usuario actualizados a líderes de aplicación y usuarios de los sistemas.	9	28/02/2019	



Cuenta Deudores



Código	H18Feb14
Hallazgo	A 31 de diciembre de 2011, en la cuenta deudores se presentan incertidumbres por \$2.363 millones, sobreestimaciones por \$150 millones y subestimaciones por \$104 millones; por su parte, a 31 de diciembre de 2012, las incertidumbres suman \$17.657,1 millones, las sobreestimaciones \$119 millones y subestimaciones \$104,5 millones
Causa	Se origina porque los saldos de esta cuenta incluyen partidas con antigüedad superior a 5 años; obligaciones inexistentes o sobre las cuales no pueden efectuarse acciones de cobro; anticipos y cajas menores sin legalizar, anticipos entregados para legalización de inmuebles, valores de arrendamiento pendientes de cruce
Responsable Actividades	Nestor Grisales - Gerente Contable



Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Solicitar informe cuatrimestral a las áreas jurídicas del estado jurídico y comercial de las cuentas por cobrar, lo anterior para establecer la viabilidad de su cobro.	Informes	4	31/12/2018	
De acuerdo al concepto jurídico informado, se presentarán dichas partidas al comité de saneamiento contable	Comités de saneamiento	2	31/12/2018	



Avalúo de Inmuebles



Código	H26Feb14
Hallazgo	A 31 de diciembre de 2011, el inventario final de inmuebles propios presenta 81 inmuebles sin avalúo. A 31 de diciembre de 2012, el inventario final de inmuebles propios presenta 82 inmuebles sin avalúo
Causa	Desactualización en reportes
Responsable Actividades	Nubia Correa – Gerente de Inmuebles y Otros Activos

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Solicitar al área de tecnología la generación de un reporte automático que muestre el avalúo de acuerdo a la política	Reporte automático	1	30/03/2018	
Incluir en la CN 31 las causales de exclusión de inmuebles para la realización de avalúos, cuando estos tengan condiciones de saneamiento particulares.	Ajuste a la circular 31 publicado	1	31/01/2018	



Consolidación Plan de Mejoramiento



Código	H02Jun14
Hallazgo	Dentro de la información reportada y presenta en el SIRECI del Plan de Mejoramiento a la auditoría 2011 y 2012 Central de Inversiones S.A. -CISA no consolidado e incluyo los hallazgos de auditorías anteriores
Causa	Inexistencia de procedimiento interno que defina actividades y responsables para la estructuración y reporte de Planes de Mejoramiento con la CGR
Responsable Actividades	Edgar Navas – Gerente de Planeación

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Generación de un procedimiento documentado para la estructuración y reporte de Planes de Mejoramiento con la CGR.	Procedimiento documentado y difundido	1	18/05/2018	



Inventario Final Inmuebles



Código	H09Jun14
Hallazgo	Según base de datos de CISA hay 24 inmuebles de las vigencias 2003,2005 y 2007 por \$1.036.5 mill en depuración contable. 22 corresponden a la venta realizada a CGA y son propiedad de CGA, pues se efectuó el pago por ésta transacción; las escrituras están a nombre de CISA por cuanto los juzgados no permitieron que se cediera el proceso al comprador
Causa	Falta de sinergia entre el área de cartera e inmuebles para dinamizar la depuración del inventario proveniente de cartera.
Responsable Actividades	Nubia Correa – Gerente de Inmuebles y Otros Activos

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Efectuar reuniones con Cartera tendientes a la depuración de los inmuebles	Reuniones trimestrales con cartera, generando informe de avance para la actualización del inventario en inmuebles y contabilidad	4	30/12/2018	
Efectuar seguimiento con responsables Jurídicos frente al avance en los procesos de saneamiento del grupo de inmuebles.	Seguimientos trimestrales y actualización en Olympus y contabilidad.	4	30/12/2018	
Revisión de los FMI del Portafolio de inmuebles de cada sucursal	Certificación del Gerente Sucursal de la revisión efectuada	4	30/11/2018	



Ejecución Presupuestal



Código	H13Jun14
Hallazgo	Central de Inversiones S.A. -CISA para la vigencia 2013 presenta una ejecución del 38% en sus ingresos, situación muy similar presentada en las vigencias anteriores (2011 y 2012)
Causa	Inexistencia de una política Nacional de gestión de Activos Públicos
Responsable Actividades	Hernán Pardo - Presidente / Comité Presidencia

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Revisar el Modelo de Negocio de CISA	Documento	1	30/11/2018	
Diseñar y proponer el marco normativo para la ley de gestión de activos	Documento	1	31/12/2018	
Optimizar el esquema de saneamiento de inmuebles	Actividades del proyecto Ejecutadas	4	31/12/2018	





Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Dinamizar las nuevas líneas de negocio	Actividades del proyecto Ejecutadas	9	01/07/2018	
Consolidar la Cartera Coactiva como línea de negocio clave para CISA	Actividades del proyecto Ejecutadas	4	31/12/2018	
Optimización de la gestión de cobranza	Actividades del proyecto Ejecutadas	9	31/12/2018	
Optimización de la movilización de inmuebles	Actividades del proyecto Ejecutadas	5	31/12/2018	
Realizar seguimientos periódicos al avance de los proyectos institucionales	Seguimientos realizados por el comité de presidencia	4	31/12/2018	

* La cantidad de entregables esta sujeto a modificación posterior a la aprobación final del Plan Estratégico Institucional en la vigencia 2018



Inmuebles registrados en los Inventarios cuyo titular no es CISA.



Código	H1.1Dic17
Hallazgo	Se encontraron 6 inmuebles registrados en el Aplicativo Olympus (administrador de la información de bienes inmuebles), los que al ser cotejados con los Certificados de Tradición y Libertad se evidenció que el propietario no es CISA sino otros terceros: ID 2011, 6503, 6650, 15852, 2134 y 15705
Causa	Falta de sinergia entre el área de cartera e inmuebles para dinamizar la depuración del inventario proveniente de cartera.
Responsable Actividades	Nubia Correa – Gerente de Inmuebles y Otros Activos

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Efectuar reuniones con Cartera tendientes a la depuración de los inmuebles	Reuniones trimestrales con cartera, generando informe de avance para la actualización del inventario en inmuebles y contabilidad	4	30/12/2018	
Efectuar seguimiento con responsables Jurídicos frente al avance en los procesos de saneamiento del grupo de inmuebles.	Seguimientos trimestrales y actualización en Olympus y contabilidad.	4	30/12/2018	
Revisión de los FMI del Portafolio de inmuebles de cada sucursal	Certificación del Gerente Sucursal de la revisión efectuada	4	30/11/2018	



Inmuebles cuyo titular es CISA, pero no se encuentran registrados en Estados Financieros



Código	H1.2Dic17
Hallazgo	En consulta al VUR, se encontraron 8 inmuebles cuyo propietario, según registro es CISA, sin embargo, no se encontraron los registros en la cuenta de Inventarios; Folios MI 080-54704 , 140-51174, 50C-1220000, 50C-1507762, 190-23915, 50C-1507760, 50C-1507761 y 50C-1507763
Causa	Falta de seguimiento a la actualización en los FMI de inmuebles que siendo garantía de obligaciones fueron cedidas a terceros.
Responsable Actividades	Nubia Correa - Gerente de Inmuebles y Otros Activos

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Efectuar reuniones con Cartera tendientes a la depuración de los 8 inmuebles	Reuniones trimestrales con cartera, generando informe de avance frente a la actualización de los FMI	4	30/12/2018	



Diferencias en los registros de Información del inventario de Inmuebles.



Código	H1.3Dic17
Hallazgo	Se encontraron diferencias por \$ 673.829.844 entre la información de avalúos de la G.Inmuebles con los datos contables de inventarios de la G.Contable. Predios: 2498, 5616, 7394, 12111, 16063, 17783, 18044, 18547, 18631, 18632, 18640, 18641, 18837, 18841, 18843, 18845, 18846, 18849, 18920, 18963, 18964.
Causa	No se revisó el valor de porcentajes de participación de los inmuebles
Responsable Actividades	Nubia Correa - Gerente de Inmuebles y Otros Activos



Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Revisión mensual de los porcentajes de participación cotejando con el informe del mes anterior	Informe de aplicación olympus-foto mensual contable	6	30/06/2018	



Inmuebles Registrados en el Inventario sin valor de Avalúo



Código	H1.4Dic17
Hallazgo	Se observó en el archivo de Inventario Contable que 3 inmuebles no registran valor en el Avalúo (campo identificado en la base de datos como % PARTC AVALUO) : ID 18632, 18964, 10713.
Causa	Desactualización en reportes
Responsable Actividades	Nubia Correa - Gerente de Inmuebles y Otros Activos


Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Solicitar al área de tecnología la generación de un reporte automático que muestre el avalúo de acuerdo a la política	Reporte automático	1	30/03/2018	
Incluir en la CN 31 las causales de exclusión de inmuebles para la realización de avalúos, cuando estos tengan condiciones de saneamiento particulares.	Ajuste a la circular 31 publicado	1	31/01/2018	



Registro contable SOFTWARE



Código	H02Dic17
Hallazgo	Revisados los Estados Financieros, los auxiliares de gastos y activos correspondientes y según la fase del proyecto (desarrollo), con corte al 31 de diciembre de 2016, se evidencia que los aplicativos COBRA, OLYMPUS y CONCISA no se encuentran incluidos en la cuenta 197008- SOFTWARE.
Causa	Falencia en el reconocimiento del software en las cuentas de intangibles
Responsable Actividades	Nestor Grisales - Gerente Contable / Sergio Moreno – Gerente de Tecnología

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Contabilización en cuentas de orden del valor que fije la firma evaluadora del software	Informe de firma evaluadora	1	31/12/2018	
Contabilización como valor de intangibles cuando sea creado un nuevo aplicativo en etapa de desarrollo	Informe del área de tecnología de los valores a contabilizar como intangibles en etapa de desarrollo	1	31/12/2018	
Ajustar la Circular contable No. 66, incluyendo en que momento se debe empezar a forjar el valor de un aplicativo de acuerdo a sus costos relacionados, únicamente cuando se configure que un aplicativo es nuevo desarrollo	Ajuste circular	1	30/06/2018	



Partidas Por Identificar



Código	H03Dic17
Hallazgo	A CISA han ingresado dineros por concepto de recaudo del cobro de cartera, de los cuales a \$ 125 millones no se les ha identificado el tercero al que corresponden. Esta suma de dinero figura a 31 de diciembre de 2016 en la cuenta 1384040998- PARTIDAS POR IDENTIFICAR , y se encuentra representada en 303 partidas que datan entre las vigencias 2009 a 2016.
Causa	Falta de información por parte del deudor para identificar el pago.
Responsable Actividades	Luis Javier Durán – Gerente de Normalización de Cartera

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Reforzar a los Gestores y Aliados de Cobro para que se le indique, al deudor que debe ingresar el número de identificación y/o obligación para determinar los pagos recibidos así como efectuar la conciliación y aplicación de las partidas que se encuentran por identificar.	Informe de gestión	12	31/12/2018	
Efectuar un informe de cierre mensual de las partidas pendientes de conciliar a la Vicepresidencia de Negocios, que permita conocer la gestión y la depuración de los valores que están pendiente para su aplicación y contabilización.	Informe de gestión	12	31/12/2018	
Reforzar con las Entidades Bancarias trimestralmente la información de los datos que deben recibir y que permiten la identificación del pago del deudor.	Informe de gestión	4	31/12/2018	





Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Llevar cada seis meses a comité de saneamiento contable las partidas no identificadas con mas de tres años de antigüedad.	Presentación al comité	2	31/12/2018	
Cruzar la base de datos de los acuerdos de pago incumplidos con las partidas pendientes de identificar.	Informe de gestión	12	31/12/2018	



Reporte SICERI



Código	H04Dic17
Hallazgo	CISA S.A. reportó únicamente las acciones de mejora relativas a los cuatro (4) hallazgos que se establecieron en la Actuación Especial de Fiscalización sobre enajenación de activos para la vigencia 2014 y el primer semestre de 2015, sin incluir, las acciones pendientes de revisión reportadas en el informe de auditoría correspondiente a la vigencia 2013
Causa	Inobservancia del Artículo 27 de la Resolución Orgánica CGR 6289 de 2011, en lo relacionado con el pronunciamiento de coherencia e integridad sobre los planes de mejoramiento Inexistencia de procedimiento interno que defina actividades y responsables para la estructuración y reporte de Planes de Mejoramiento con la CGR
Responsable Actividades	Elkin Angel - Auditor Interno


Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Registrar en el SIRECI la totalidad de los hallazgos correspondientes a las acciones pendientes de revisión de las vigencias 2013 y anteriores.	Reporte en el SIRECI	1	29/06/2018	
Generación de un procedimiento documentado para la estructuración y reporte de Planes de Mejoramiento con la CGR.	Procedimiento documentado y difundido	1	18/05/2018	



Ejecución Detallada de Actividades



Plan Implementación y Mejora MIPG V2

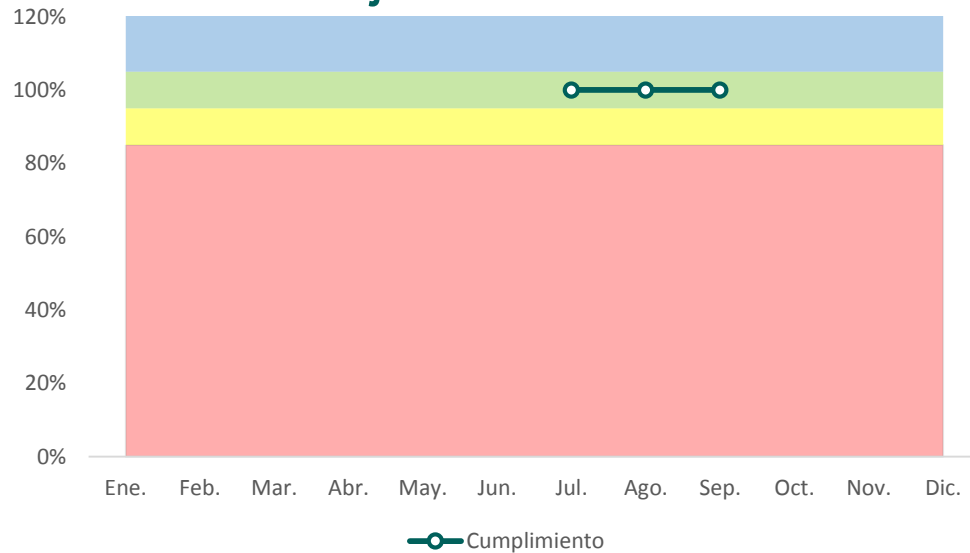

Análisis:

Al 30 de septiembre de 2018, se ha obtenido un cumplimiento acumulado de 100% lo que lo configura como una ejecución excelente, conforme a lo planeado por los diferentes procesos institucionales. (para mayor detalle ver anexo 1)

Convenciones



Actividad Completada en el tiempo y con el alcance planteado



Actividad completada fuera del tiempo planteado



Actividad rezagada



Plan de Implementación y Mejora MIPG V2



En cumplimiento al Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, CISA realizará las actividades orientadas a la implementación de la versión 2 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión



* Para detalle de cada Actividad haga Clic en el Circulo correspondiente





Política: Gestión Estratégica del Talento Humano

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Incluir en el Plan de Capacitación actividades de sostenibilidad ambiental	Incluir en el Plan de Capacitación actividades de sostenibilidad ambiental (desde los fortalecimientos de SIG - conceptos de ambiental)*	Listados de asistencia a capacitaciones	Gerente Recursos de	30/09/2018	
Realizar un diagnóstico de las personas interesadas en el programa de Bilingüismo	Realizar un diagnóstico de las personas interesadas en el programa de Bilingüismo	Documento de diagnostico realizado	Gerente Recursos de	30/10/2018	
Desarrollar ferias de vivienda	Desarrollar con el apoyo de la caja de compensación o de terceros ferias de vivienda	Fotografías de ferias de vivienda realizadas	Gerente Recursos de	30/10/2018	
Incluir actividades de educación en artes y artesanías	Incluir actividades de educación en artes y artesanías en las actividades que corresponda	Listados de asistencia a actividades, registros fotográficos	Gerente Recursos de	30/11/2018	
Desarrollar estrategias de trabajo en equipo	En el desarrollo de las diferentes actividades incluir estrategias de trabajo en equipo	Documento resumen de estrategias desarrolladas	Gerente Recursos de	30/11/2018	





Política: Gestión Estratégica del Talento Humano

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Actualizar y formalizar la encuesta de retiro	Actualizar y formalizar la encuesta de retiro*	Correo SIG de actualización de la encuesta	Gerente Recursos de	31/12/2018	
Analizar la viabilidad de implementar programas de reconocimiento de la trayectoria laboral	Analizar la viabilidad de implementar programas de reconocimiento de la trayectoria laboral y agradecimiento por el servicio prestado a las personas que se desvinculan en el programa de PREPENSIONADOS a diseñar.	Documento de análisis elaborado y presentado	Gerente Recursos de	31/12/2018	
Diseñar el programa de PREPENSIONADOS	Diseñar el programa de PREPENSIONADOS, el cual, incluirá entre otras, estrategias para brindar apoyo socio laboral y emocional a las personas que se desvinculan.	Presentación de programa de PREPENSIONADO a instancia correspondiente	Gerente Recursos de	31/12/2018	





Política: Integridad

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Socializar los valores	Realizar campañas al interior de la organización o socializar por medio del plan de capacitación la actualización de los valores corporativos en concordancia con el código de integridad	Difusión y sensibilización de los valores corporativos	Gerente de Recursos	30/11/2018	



DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN



Política: Planeación Institucional

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Contratar Consultor Externo para apoyar a CISA en la definición de su Plan Estratégico	Realizar el proceso de contratación para la consultoría de revisión, análisis y ajuste del modelo de negocio una vez terminada la ley de garantías	Contrato suscrito	Gerente Planeación de	31/10/2018	
Realizar análisis con participación de Externos, Equipo Directivo y JD	Realizar los análisis en desarrollo de la consultoría	Actas de reunión	Gerente Planeación de	31/12/2018	
Generar recomendaciones y ajustes al Modelo de Negocio de CISA	Realizar los análisis en desarrollo de la consultoría	Documento final de consultoría	Gerente Planeación de	31/12/2018	
Identificar posibles proyectos para el Plan Estratégico 2019-2022	Generar posibles proyectos de acuerdo a las recomendaciones planteadas por la consultoría como insumo para la generación del plan estratégico institucional 2019-2022	Proyectos identificados	Gerente Planeación de	31/01/2019	



GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO



Política: Servicio al Ciudadano

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Incorporar un procedimiento para actuación en caso de desistimiento tácito	Incorporar dentro de la documentación del proceso, un procedimiento para actuación en caso de desistimiento tácito	Procedimiento incorporado en la circular normativa correspondiente	Jefe Servicio Integral al Usuario	30/11/2018	



GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO



Política: Participación Ciudadana en la Gestión Pública


Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Generar el informe sobre el plan de participación ciudadana y rendición de cuentas 2018	Generar un informe sobre el plan de participación ciudadana y rendición de cuentas el cual servirá como base para el diagnóstico y opciones de mejora a implementar en la siguiente vigencia	Informe de evaluación al plan de participación ciudadana.	Auditor Interno	24/08/2018	
Definir una propuesta metodológica para la estructuración de los ejercicios de Participación y RC	Definir una propuesta que permita estructurar la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas anuales	Documento con propuesta metodológica	Gerente de Planeación	15/08/2018	
Revisar, analizar y complementar la metodología propuesta	Revisar, analizar y complementar la metodología propuesta en los aspectos relacionados con tecnología, comunicaciones, servicio integral al usuario y las áreas misionales	Documento final con la metodología revisada y ajustada	Gerente de Planeación	05/09/2018	



GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO



Política: Participación Ciudadana en la Gestión Pública

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Formalizar y socializar la metodología	Una vez surtidas las revisiones de la propuesta metodológica y efectuados los ajustes a que hubiera lugar, formalizar y socializar la metodología al interior de la entidad	Correo SIG	Gerente Planeación de	15/09/2018	
Coordinar la definición de acciones y presupuesto para el Plan Anticorrupción	Coordinar la definición de acciones y presupuesto para el Plan Anticorrupción en concordancia con el inicio del proceso de programación presupuestal 2019	Necesidades presupuestales para participación ciudadana y rendición de cuentas identificadas	Gerente Planeación de	31/10/2018	
Actualizar la metodología para la caracterización de los grupos de interés de CISA	Con base en la documentación actual, realizar una revisión de su alcance, y actualizarla si es el caso, de manera que se estandaricen los ejercicios de caracterización de grupos de interés en cuanto a sus responsabilidades, mantenimiento, divulgación y retroalimentación por parte de los áreas de la Entidad	Metodología para la caracterización de grupos de interés actualizada	Gerente Proyectos de	31/12/2018	



GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO



Política: Racionalización de Trámites

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Sensibilizar sobre la estrategia de racionalización de trámites	Realizar reunión de sensibilización con los servidores públicos responsables de la implementación de la estrategia de racionalización en la Entidad.	Registro de asistencia a la capacitación y documento con la presentación realizada	Jefe Mejoramiento Continuo	31/07/2018	
Generar campañas internas sobre los resultados y objetivos de la racionalización de trámites	Generar comunicaciones a través de los canales de comunicación interna (Canal de Comunicaciones, Boletín interno ?CISA al día?), informando el objetivo y los resultados esperados de la estrategia de racionalización de trámites y el los beneficios que se espera obtengan los ciudadanos.	Comunicaciones publicadas en el canal de comunicaciones y Boletín interno CISA al día, donde se informe a los colaboradores el objetivo y los resultados esperados de la estrategia de racionalización de trámites y el los beneficios que se espera obtengan los ciudadanos	Jefe Servicio Integral al Usuario	31/08/2018	
Realizar una campaña de comunicación sobre impactos y beneficios de la racionalización de trámites	Realizar una campaña de comunicación dirigida a los ciudadanos, para presentarles cómo se ven impactados o beneficiados, con los resultados que se obtiene de la estrategia de racionalización de trámites implementada por Central de Inversiones S.A.	Comunicaciones dirigidas a los ciudadanos a través de las redes sociales, donde se les indique cómo se ven impactados o beneficiados, con los resultados que se obtiene de la estrategia de racionalización de trámites implementada por Central de Inversiones S.A.	Jefe Servicio Integral al Usuario	30/09/2018	



GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO



Política: Gobierno Digital

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar acciones que permitan alcanzar un umbral de 70 puntos - Gobierno Digital	Realizar acciones que permitan alcanzar un umbral de 70 puntos sobre las actividades identificadas con menor puntaje y con análisis realizado	Autodiagnóstico Actualizado	Director de Tecnología	31/10/2018	



GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO



Política: Defensa Jurídica

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Verificar la Incorporación de las audiencias de conciliación	Verificar la Incorporación de las audiencias de conciliación solicitadas ante la procuraduría entre enero y junio de 2018 en Ekogui	Informe de incorporación de audiencias	Gerente Jurídica del Negocio	30/07/2018	
Preparar informe sobre las conciliaciones celebradas 1 Semestre	Preparar un informe sobre las conciliaciones celebradas con corte a 30 de Junio de 2018, para ser entregado a los miembros del comité. Primer semestre	Informe Elaborado y presentado, remitido por correo electrónico	Gerente Jurídica del Negocio	31/07/2018	
Verificar las fichas guía de Ekogui	Verificar las fichas guía de Ekogui	lectura de fichas e implementación de mejoras practicas si es del caso	Gerente Jurídica del Negocio	30/10/2018	
Formular y presentar el plan de acción del comité de conciliación	Formular y presentar el plan de acción del comité de conciliación	Plan elaborado y presentado	Gerente Jurídica del Negocio	30/11/2018	
Preparar informe sobre las conciliaciones celebradas 2 Semestre	Preparar un informe sobre las conciliaciones celebradas con corte a 31 de diciembre de 2018, para ser entregado a los miembros del comité. Segundo semestre	Informe Elaborado y presentado, remitido por correo electrónico	Gerente Jurídica del Negocio	31/01/2019	



INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN





Política: Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Generar una encuesta de satisfacción del ciudadano sobre el botón Transparencia	Generar una encuesta de satisfacción del ciudadano sobre el botón Transparencia y acceso a la información en el sitio Web oficial	-Encuesta incorporada en el botón de transparencia	Jefe Comunicaciones Corporativas	30/08/2018	
Mejorar el flujo de ZEUS para la desvinculación de personal	El conocimiento que no sea técnico y que dependa de las responsabilidades del cargo, como por ejemplo: circulares a aplicar, flujos en los que interviene, atribuciones, actividades asignadas en planes institucionales y permisos en aplicativos entre otros, serán incluidos en ZEUS para con ello fortalecer uno de los mecanismos dispuestos para la transferencia de conocimiento efectiva	-Flujo de desvinculación ZEUS actualizado	Gerente de Recursos	31/08/2018	
Realizar campañas internas en transparencia y acceso a la información	Realizar una campaña interna que contemple: 1. Difusión de las instancias con las que cuentan los ciudadanos para recurrir en caso de no recibir respuesta ante una solicitud de información 2. Conocimiento de funciones y alcance de la Secretaría de Transparencia 3. Sensibilización sobre la importancia de la satisfacción de los ciudadanos como dueños de los recursos del estado 4. Sensibilización sobre la transparencia y a la información pública como elementos fundamentales para la modernización del Estado	-Campañas de sensibilización realizadas a través de los boletines	Jefe Comunicaciones Corporativas	31/12/2018	





Política: Gestión Documental

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar el Inventario de la documentación de los archivos de gestión en el FUID	Realizar el Inventario de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental - FUID	Documento inventario realizado	Gerente Recursos	30/09/2018	
Realizar el Inventario de la documentación del archivo central en el FUID	Realizar Inventario de la documentación del archivo central en el Formato Único de Inventario Documental - FUID: (Levantamiento de los inventarios documentales)	Documento inventario realizado	Gerente Recursos	30/09/2018	
Elaborar plan para la Implementación los requisitos de los documentos electrónicos de archivo	Plan para la implementación de los requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, preservación y metadatos de los documentos electrónicos de archivo en el Sistema de Gestión de Documento Electrónico	Plan Formulado	Gerente Recursos	30/12/2018	




Otros Planes Decreto 612



En cumplimiento al decreto 612 de 2018, se plantea la integración de 12 planes de acción institucionales en el marco del plan de acción anual.

En esta sección encontrará aquellos que no han sido analizados en las secciones anteriores.

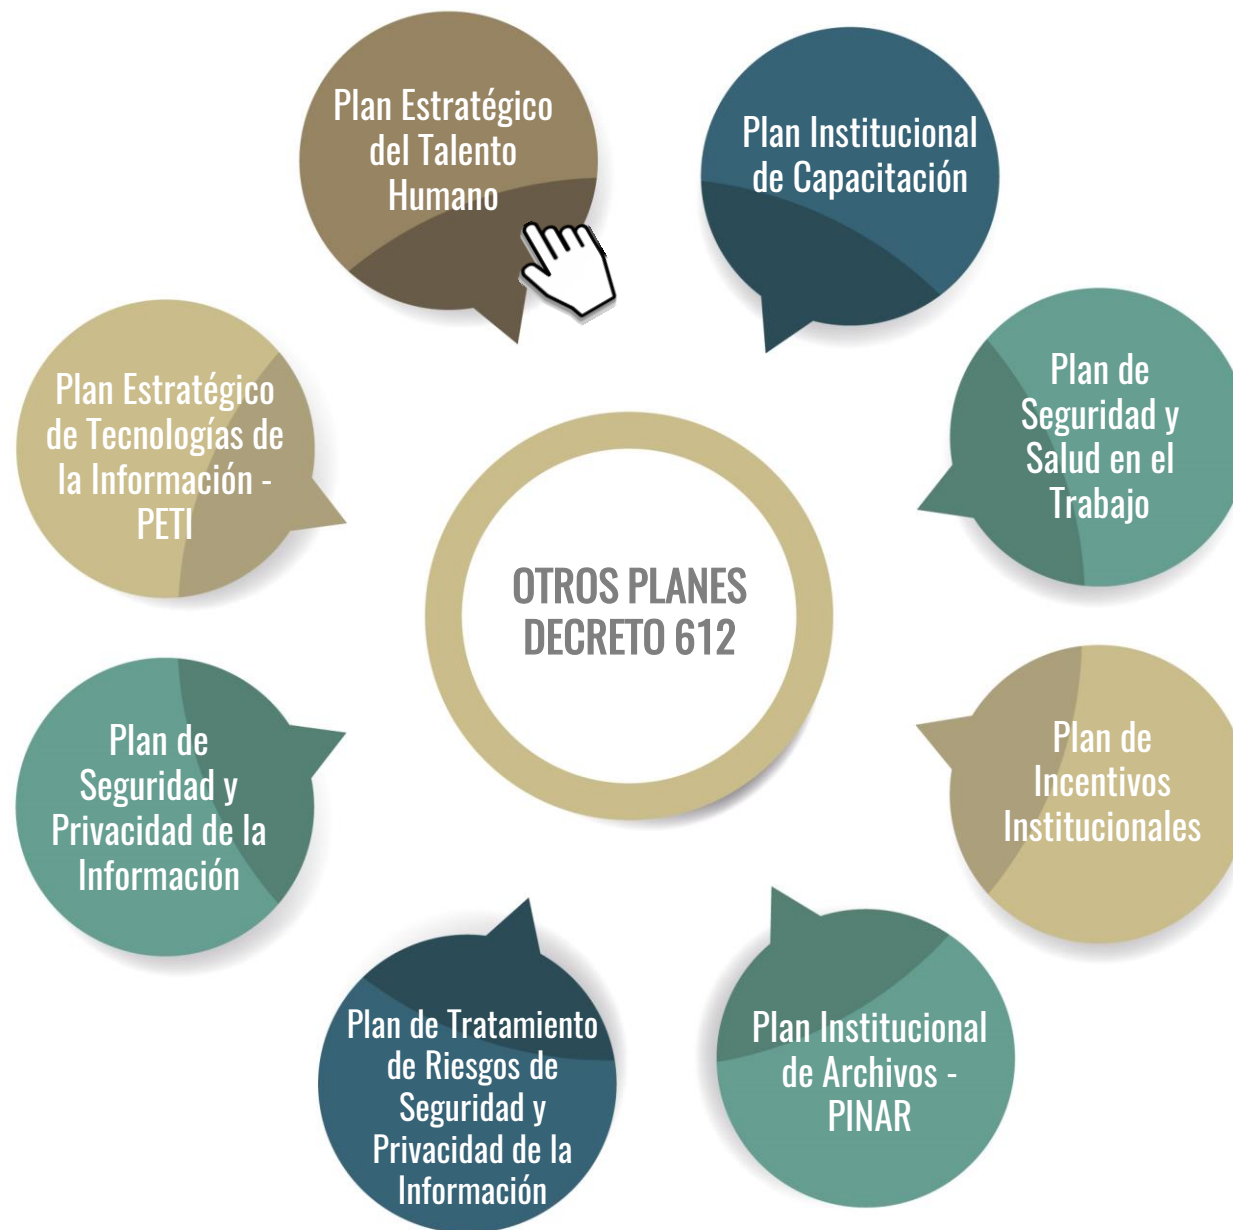

* Para detalle de cada Actividad haga Clic en el Circulo correspondiente



Plan Estratégico de Talento Humano



Garantizar una organización que trabaje en equipo con altos estándares de servicio y transparencia, orientada a la satisfacción de los clientes y accionistas





* Para detalle de cada Elemento haga Clic en el Circulo correspondiente





Selección por competencias Alineado con MIPG - INGRESO

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Redefinir competencias tipo de los colaboradores de CISA alineadas a la estrategia	Proceso: Selección por Competencias (Planta con contrato a termino indefinido)	Competencias organizacionales documentadas y formalizadas	Gerente de Recursos	31/07/2018	
Adecuar el proceso selección de personal con base en las competencias definidas	Proceso: Selección por Competencias	Circular 24 ajustada	Gerente de Recursos	31/07/2018	



Plan Estratégico de Talento Humano



Gestión del Desarrollo Humano y Profesional Alineado con “DESARROLLO” del MIPG

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Caracterizar colaboradores	Hacer un diagnóstico de la edad, nivel educativo, experiencia, antigüedad y género (entre otros) que permita conocer las características principales de la población para aquellos colaboradores que encuentren en la Planta Indefinida	Caracterización de los colaboradores	Gerente de Recursos	26/10/2018	
Caracterizar los cargos	Hacer un diagnóstico de los perfiles, manuales de responsabilidades y competencias de los cargos de la planta indefinida para aquellos colaboradores que encuentren en la Planta Indefinida	Caracterización de cargos	Gerente de Recursos	26/10/2018	
Formular e implementar el plan institucional de capacitaciones	Definir el plan de capacitaciones que permita desarrollar las competencias de los colaboradores	PIC ejecutado	Gerente de Recursos	31/12/2018	
Realizar evaluaciones de desempeño y toma de Acciones	Con base en las actuales competencias, se realizará la medición definida	Informe gerencial de desempeño	Gerente de Recursos	31/12/2018	




Plan Estratégico de Talento Humano



Liderazgo basado en la confianza

Alineado con “DESARROLLO” del MIPG


Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Generar diagnóstico sobre liderazgo	El diagnóstico se elabora basado en los resultados de la encuesta de felicidad corporativa, evaluación de riesgo psicosocial y evaluación del desempeño	Diagnóstico elaborado	Gerente de Recursos	15/02/2018	
Realizar actividades de liderazgo	Realizar actividades enfocadas en el desarrollo de competencias de liderazgo basadas en la confianza	Actividades desarrolladas	Gerente de Recursos	31/08/2018	
Realizar la medición de control y toma de decisiones	Realizar medición de felicidad corporativa, evaluación de riesgo psicosocial y evaluación del desempeño	Informe gerencial de liderazgo	Gerente de Recursos	31/12/2018	



Plan Estratégico de Talento Humano



Bienestar, incentivos, felicidad y SST Alineado con “DESARROLLO” del MIPG

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar acciones de mantenimiento del Modelo EFR	Mejorar la calidad de vida de los empleados a través del mantenimiento del modelo EFR	Informe de auditoria	Gerente de Recursos	31/07/2018	
Definir e implementar el plan de acción de felicidad corporativa	Con base en los resultados de la medición de felicidad corporativa 2017, se definirán las acciones a ejecutar en el 2018.	Ejecución de las actividades planeadas	Gerente de Recursos	30/12/2018	
Desarrollar el plan de SST y bienestar	Contribuir al mejoramiento de la cultura de prevención y manejo de riesgos en el entorno laboral y desarrollar e implementar programas de bienestar que incentiven al compromiso con la empresa y satisfagan las necesidades de cada trabajador, haciendo que cada uno de ellos se sienta parte de la familia “CISA”	Plan de SST y bienestar	Gerente de Recursos	31/12/2018	



Plan Estratégico de Talento Humano



Relaciones laborales y gestión de la compensación Alineado con “DESARROLLO” del MIPG


Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Administrar la Nómina	Administrar la nómina y seguridad social de los empleados de la entidad.	Nóminas pagadas	Gerente de Recursos	31/12/2018	
Generar estadísticas de compensación variables	Generación de estadísticas por el cumplimiento de los indicadores individuales de los colaboradores. (compensación variable) que permitan tener información sobre la Gestión de la compensación en la Entidad.	Informe con estadísticas para toma de decisiones	Gerente de Recursos	31/12/2018	





Retiro

Alineado con “RETIRO” del MIPG

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Mejorar el flujo de ZEUS para la desvinculación de personal	El conocimiento que no sea técnico y que dependa de las responsabilidades del cargo, como por ejemplo: circulares a aplicar, flujos en los que interviene, atribuciones, actividades asignadas en planes institucionales y permisos en aplicativos entre otros, serán incluidos en ZEUS para con ello fortalecer uno de los mecanismos dispuestos para la transferencia de conocimiento efectiva	Flujo de desvinculación de ZEUS actualizado	Gerente de Recursos	31/08/2018	
Diseñar el programa de PREPENSIONADOS	Diseñar el programa de PREPENSIONADOS, el cual, incluirea entre otras, estrategias para brindar apoyo sociolaboral y emocional a las personas que se desvinculan.	Presentación de programa de PRE PENSIONADO a instancia correspondiente	Gerente de Recursos	31/12/2018	
Realizar encuestas de retiro de colaboradores	Con el propósito de conocer las razones por las cuales los colaboradores se retiran voluntariamente se aplicarán encuestas de desvinculación	Diagnóstico de principales causas de retiro voluntario	Gerente de Recursos	31/12/2018	



Plan Institucional de Capacitación – PIC



Diseñar e implementar el PIC para fortalecer, desarrollar y mantener las competencias del talento humano de CISA.



* Para detalle de cada Elemento haga Clic en el Circulo correspondiente



Plan Institucional de Capacitación – PIC



Liderazgo

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar actividades sobre habilidades gerenciales y directivas	Realizar un proceso de desarrollo profesional y personal para el equipo directivo de Central de Inversiones durante 6 sesiones, enfocado a aumentar la capacidad de liderazgo a través del SER y mejorando sus habilidades de escucha, liderazgo, desarrollo de talento, empoderamiento y retroalimentación.	Registros de asistencia	Gerente de Recursos	31/07/2018	
Generar espacios de formación en liderazgo para el presidente	Gestionar la participación en un seminario donde se conozcan las mejores prácticas de liderazgo a nivel internacional.	Inscripción y certificado de participación	Gerente de Recursos	30/08/2018	
Realizar actividades sobre habilidades de supervisión	Realizar un proceso de desarrollo profesional y personal para el equipo de jefes y coordinadores de Central de Inversiones, enfocado a aumentar la capacidad de liderazgo a través del SER y mejorando sus habilidades y competencias.	Registros de asistencia	Gerente de Recursos	30/11/2018	



Plan Institucional de Capacitación – PIC



SST


Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Formar las brigada de emergencia	Formar las brigadas de emergencia y proporcionar a los integrantes los conocimientos teóricos y prácticos para enfrentar eficazmente las emergencias que pueden surgir en la empresa.	Registro de asistencia	Gerente de Recursos	30/12/2018	
Formar las Brigada de emergencia sucursal Medellín	Formar las brigadas de emergencia y proporcionar a los integrantes los conocimientos teóricos y prácticos para enfrentar eficazmente las emergencias que pueden surgir en la empresa.	Registro de asistencia	Gerente de Recursos	30/12/2018	
Formar las Brigada de emergencia sucursal Cali	Formar las brigadas de emergencia y proporcionar a los integrantes los conocimientos teóricos y prácticos para enfrentar eficazmente las emergencias que pueden surgir en la empresa.	Registro de asistencia	Gerente de Recursos	30/12/2018	
Formar las Brigada de emergencia sucursal Barranquilla	Formar las brigadas de emergencia y proporcionar a los integrantes los conocimientos teóricos y prácticos para enfrentar eficazmente las emergencias que pueden surgir en la empresa.	Registro de asistencia	Gerente de Recursos	30/12/2018	
Fortalecer los conocimientos sobre el SGSST y su implementación.	Realizar curso de 50 horas SENA del sistema de SST	Certificaciones	Gerente de Recursos	30/12/2018	
Fortalecer los conocimientos sobre Trabajo Seguro en Alturas	Fortalecer los conocimientos sobre Trabajo Seguro en Alturas, los supervisores de ordenes de servicio que les aplique trabajo en alturas de las sucursales.	Certificaciones	Gerente de Recursos	30/12/2018	
Fortalecer los conocimientos sobre control operacional	Fortalecer los conocimientos sobre control operacional para los supervisores de ordenes de servicio que les aplique.	Registro de asistencia	Gerente de Recursos	30/12/2018	



Plan Institucional de Capacitación – PIC



Gestión documental y seguridad de la información



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar capacitación sobre seguridad de la información	Presentar componentes de seguridad de la información y ciberseguridad.	Registros de asistencia	Gerente de Recursos	30/09/2018	
Realizar capacitación sobre gestión documental	Capacitar en la Circular Normativa 023 – Programa de Gestión Documental: Aplicación de Tablas de Retención Documental, organización de expedientes, transferencias, y demás temas relacionados con la gestión documental en la Entidad.	Registros de asistencia	Gerente de Recursos	31/12/2018	



Plan Institucional de Capacitación – PIC



Desarrollo de competencias

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Consolidar el diagnóstico de necesidades de capacitación formuladas en los PID	Con base en los planes individuales de desarrollo enviados por los colaboradores se realizará la consolidación y priorización de las necesidades de capacitación.	Diagnóstico	Gerente de Recursos	30/06/2018	
Actualizar el PIC	Con base en las necesidades identificadas en los PIDD se realizará la actualización del PIC	PIC actualizado	Gerente de Recursos	30/08/2018	



Plan Institucional de Capacitación – PIC



Gestión de la calidad y ambiental

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Fortalecer conceptos básicos de calidad y ambiental	Fortalecer los conocimientos sobre planes y programas ambientales, indicadores, caracterizaciones, control de producto no conforme, requisitos legales y control operacional.	Registros de asistencia	Gerente de Recursos	30/09/2018	
Fortalecer los conocimientos sobre acciones correctivas y de mejora	Fortalecer los conocimientos sobre la nueva metodología de identificación, tratamiento y seguimiento de acciones correctivas y de mejora.	Registros de asistencia	Gerente de Recursos	30/09/2018	
Fortalecer los conocimientos sobre sustancias químicas, MSDS, etiquetado y rotulado	Fortalecer los conocimientos sobre el manejo, almacenamiento y manipulación de sustancias químicas.	Registros de asistencia	Gerente de Recursos	30/09/2018	
Fortalecer los conocimientos en riesgos	Fortalecer los conceptos de gestión y administración de riesgos corporativos (operativos y de corrupción)	Registros de asistencia	Gerente de Recursos	30/09/2018	



Plan Institucional de Capacitación – PIC



Integridad

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Socializar los valores	Realizar campañas al interior de la organización o socializar por medio del plan de capacitación la actualización de los valores corporativos en concordancia con el código de integridad	Difusión y sensibilización de los valores corporativos	Gerente de Recursos	30/11/2018	



Plan de Incentivos Institucionales



Ofrecer incentivos emocionales a través de la conciliación que están enmarcados en el modelo de empresa familiarmente responsable.

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Revisar el manual efr	Teniendo en cuenta las observaciones de la última auditoria revisar la pertinencia del manual efr	Manual efr actualizado	Gerente de Recursos	30/09/2018	
Trasladar en función de las posibilidades de CISA y con base en la influencia en los proveedores las principales medidas efr.	Verificar a que terceros es posible trasladar los beneficios EFR	Diagnóstico de análisis de medidas EFR en terceros	Gerente de Recursos	30/09/2018	
Generar estadísticas de utilización de las medidas efr	Con base en los radicados de ZEUS correspondientes a beneficios emocionales realizar estadísticas de utilización de las medidas	Estadísticas de utilización	Gerente de Recursos	30/09/2018	
Revisar las zonas de almuerzo de las sucursales por el volumen del personal	Con base en el diagnóstico del modelo efr revisar la ampliación de las zonas de almuerzo de las sucursales.	Estadísticas de utilización	Gerente de Recursos	30/09/2018	
Realizar divulgación del modelo efr.	Realizar divulgación de objetivos, alcance, equipo, medidas, comité de convivencia, canales de comunicación que impactan el modelo efr.	Evidencias de las divulgaciones	Gerente de Recursos	30/12/2018	
Realizar sensibilización a los líderes rol que desempeñan en el modelo efr.	Realizar sensibilización a los líderes con personas a cargo del rol que desempeñan en el modelo efr.	Registros de asistencia	Gerente de Recursos	30/09/2018	



Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo




Objetivos

- ✓ Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.
- ✓ Proteger la seguridad y salud de todos los colaboradores, mediante la mejora continua del SG-SST.
- ✓ Mantener las condiciones de ergonomía de los puestos de trabajo.
- ✓ Mejorar las condiciones de seguridad de las instalaciones de CISA.
- ✓ Reducir los incidentes de origen profesional, ya sean accidentes de trabajo o enfermedades laborales.
- ✓ Mejorar el clima organizacional.



Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Mediciones de iluminación	Realizar evaluaciones de niveles de intensidad de iluminación de las áreas y/o puestos de trabajo seleccionados, con el fin de establecer y ejecutar las modificaciones para controlar la fuente del riesgo.	Soportes de registro de ejecución de la actividad	Gerente de Recursos	30/09/2018	
Exámenes médicos periódicos	Realizar los evaluación periódicas con el fin de detectar alteraciones en la salud de los trabajadores (Énfasis osteomuscular, optometría, audiometría, laboratorios clínicos (Colesterol, Glicemia Basal, Triglicéridos))	Soportes de registro de ejecución de la actividad	Gerente de Recursos	30/10/2018	
Evaluaciones optométricas	Realizar los diagnósticos de salud visual periódicos a los trabajadores de CISA (optometría)	Soportes de registro de ejecución de la actividad	Gerente de Recursos	30/10/2018	
Diagnóstico de riesgo psicosocial	Identificar, monitorear e intervenir la exposición a los factores de riesgo psicosocial de los colaboradores para mejorar sus condiciones de salud y de trabajo.	Informe de riesgo psicosocial	Gerente de Recursos	30/10/2018	
Pausas activas	Actividades enfocadas a disminuir el cansancio generado a nivel músculo esquelético, visual y mental.	Soportes de registro de ejecución de la actividad	Gerente de Recursos	30/11/2018	
Seguimientos individuales a las recomendaciones médicas (Semestral)	Realizar seguimiento a los trabajadores seguimiento de los resultados de los exámenes médicos periódicos.	Correos de evidencia de seguimiento	Gerente de Recursos	30/11/2018	
Inspecciones a las estaciones de trabajo	Identificar peligros que afecten a los colaboradores en el puesto o ambiente de trabajo.	Soportes de registro de ejecución de la actividad	Gerente de Recursos	30/12/2018	
Inspecciones ambientales y de seguridad en el trabajo	Identificar los peligros que afecten a los colaboradores, el ambiente y los procesos a través de las inspecciones planeadas.	Soportes de registro de ejecución de la actividad	Gerente de Recursos	30/12/2018	



Plan Institucional de Archivos - PINAR




Objetivos:

- Elaborar y/o actualizar las herramientas archivísticas: Tablas de Retención Documental – TRD, Cuadro de Clasificación Documental – CCD, Tablas de Valoración Documental – TVD e Inventarios Documentales, para asegurar el control y buen manejo de la información.
- Diseñar manuales, instructivos y formatos para normalizar y estandarizar los procesos de la función archivística, sobre todo los tendientes a la organización documental.
- Organizar adecuadamente los archivos de gestión y central de CISA bajo los parámetros establecidos, normatividad vigente y aplicando las herramientas diseñadas para tal fin.



Plan Institucional de Archivos - PINAR



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Elaborar programa de gestión de documentos electrónicos	Elaborar una herramienta que permita normalizar la gestión de los documentos electrónicos de CISA	Programa de gestión de documentos electrónicos publicado y divulgado	Vicepresidente Financiero y Administrativo	30/09/2018	
Actualizar Tablas de Retención Documental	Actualizar las Tablas de Retención de acuerdo al último cambio orgánico – funcional y conforme lo establecido por el AGN	Tablas de Retención Documental publicadas y divulgadas	Vicepresidente Financiero y Administrativo	05/10/2018	
Realizar capacitación continua en materia de archivo	Capacitar a los funcionarios de CISA en temas archivísticos enfocados en la aplicación de las TRD, organización de archivos de gestión, consultas, devoluciones, entregas e incorporaciones de documentos.	Listas de asistencia	Vicepresidente Financiero y Administrativo	31/12/2018	
Elaborar Tablas de Valoración Documental	Elaboración de las Tablas de Valoración conforme a lo establecido por el AGN	Tablas de Valoración Documental publicadas y divulgadas	Vicepresidente Financiero y Administrativo	15/01/2019	



Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información



Identificar, evaluar, tratar y dar seguimiento a los riesgos de seguridad de la información a los que estén expuestos los activos de información con clasificación alta en cualquiera de los pilares de Seguridad de la Información (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad).

Nota:

El plan se encuentra formulado y en ejecución. Considerando que el plan puede contener información sensible propiedad de CISA, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño optó por no realizar la publicación de las actividades puntuales. No obstante, la entidad realiza seguimiento periódico a las actividades propuestas.



Plan de Seguridad y Privacidad de la Información





Identificar, evaluar, tratar y dar seguimiento a los riesgos de seguridad de la información a los que estén expuestos los activos de información con clasificación alta en cualquiera de los pilares de Seguridad de la Información (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad).



Plan de Seguridad y Privacidad de la Información



SGSI

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Actualizar activos de información - CR	El apoyo operativo de los diferentes procesos en conjunto con el oficial de seguridad de la información; validan, actualizan y clasifican el inventario de activos de información para los procesos misionales e Infraestructura Tecnológica.	Herramienta del SGSI NovaSec actualizada	Jefe de Comunicaciones Corporativas	30/07/2018	
Actualizar activos de información - GAC	El apoyo operativo de los diferentes procesos en conjunto con el oficial de seguridad de la información; validan, actualizan y clasifican el inventario de activos de información para los procesos misionales e Infraestructura Tecnológica.	Herramienta del SGSI NovaSec actualizada	Gerente de Cartera	30/07/2018	
Actualizar activos de información - GAI	El apoyo operativo de los diferentes procesos en conjunto con el oficial de seguridad de la información; validan, actualizan y clasifican el inventario de activos de información para los procesos misionales e Infraestructura Tecnológica.	Herramienta del SGSI NovaSec actualizada	Gerente de Inmuebles	30/07/2018	
Actualizar activos de información - GJN	El apoyo operativo de los diferentes procesos en conjunto con el oficial de seguridad de la información; validan, actualizan y clasifican el inventario de activos de información para los procesos misionales e Infraestructura Tecnológica.	Herramienta del SGSI NovaSec actualizada	Gerente Jurídica del Negocio	30/07/2018	
Actualizar activos de información - IT	El apoyo operativo de los diferentes procesos en conjunto con el oficial de seguridad de la información; validan, actualizan y clasifican el inventario de activos de información para los procesos misionales e Infraestructura Tecnológica.	Herramienta del SGSI NovaSec actualizada	Director de Tecnología	30/07/2018	



Plan de Seguridad y Privacidad de la Información



SGSI

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Actualizar activos de información - SE	El apoyo operativo de los diferentes procesos en conjunto con el oficial de seguridad de la información; validan, actualizan y clasifican el inventario de activos de información para los procesos misionales e Infraestructura Tecnológica.	Herramienta del SGSI NovaSec actualizada	Vicepresidente de Negocios	30/07/2018	
Actualizar activos de información - SIU	El apoyo operativo de los diferentes procesos en conjunto con el oficial de seguridad de la información; validan, actualizan y clasifican el inventario de activos de información para los procesos misionales e Infraestructura Tecnológica.	Herramienta del SGSI NovaSec actualizada	Jefe de Servicio Integral al Usuario	30/07/2018	
Actualizar la política de datos personales	Se realiza revisión a la política de datos personales y en caso de que lo requiera se realiza la respectiva actualización	Memorando Circular de datos personales actualizado	Gerente de Planeación	30/07/2018	
Analizar los riesgos y definir de plan de tratamiento de Seguridad de la Información - 1	El apoyo operativo de los diferentes procesos en conjunto con el oficial de seguridad de la información; identifican, evalúan, tratan y dan seguimiento a los riesgos de seguridad de la información a los que estén expuestos los activos de información con clasificación alta	Herramienta del SGSI NovaSec actualizada	Gerente de Planeación	31/07/2018	
Reportar Indicadores - 1	Se realiza de forma trimestral y semestral la medición de los objetivos del sistema de seguridad de la información	Reporte en Isolucion actualizado	Gerente de Planeación	31/07/2018	
Reportar Indicadores - 2	Se realiza de forma trimestral y semestral la medición de los objetivos del sistema de seguridad de la información	Reporte en Isolucion actualizado	Gerente de Planeación	30/07/2018	



Plan de Seguridad y Privacidad de la Información



SGSI

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Actualizar matriz de requisitos legales de seguridad de la información - 1	De forma semestral se valida la aplicabilidad de los requisitos legales de seguridad de la información y se define plan para dar cumplimiento.	Matriz de requisitos legales de seguridad de la información actualizada	Gerente de Planeación	30/08/2018	
Analizar los riesgos y definir de plan de tratamiento de Seguridad de la Información - 2 - GJN	El apoyo operativo de los diferentes procesos en conjunto con el oficial de seguridad de la información; identifican, evalúan, tratan y dan seguimiento a los riesgos de seguridad de la información a los que estén expuestos los activos de información con clasificación alta	Herramienta del SGSI NovaSec actualizada	Gerente Jurídica del Negocio	30/08/2018	
Analizar los riesgos y definir de plan de tratamiento de Seguridad de la Información - 2 - IT	El apoyo operativo de los diferentes procesos en conjunto con el oficial de seguridad de la información; identifican, evalúan, tratan y dan seguimiento a los riesgos de seguridad de la información a los que estén expuestos los activos de información con clasificación alta	Herramienta del SGSI NovaSec actualizada	Director de Tecnología	30/08/2018	
Analizar los riesgos y definir de plan de tratamiento de Seguridad de la Información - 2 - CR	El apoyo operativo de los diferentes procesos en conjunto con el oficial de seguridad de la información; identifican, evalúan, tratan y dan seguimiento a los riesgos de seguridad de la información a los que estén expuestos los activos de información con clasificación alta	Herramienta del SGSI NovaSec actualizada	Jefe de Comunicaciones Corporativas	30/08/2018	
Analizar los riesgos y definir de plan de tratamiento de Seguridad de la Información - 2 - GAC	El apoyo operativo de los diferentes procesos en conjunto con el oficial de seguridad de la información; identifican, evalúan, tratan y dan seguimiento a los riesgos de seguridad de la información a los que estén expuestos los activos de información con clasificación alta	Herramienta del SGSI NovaSec actualizada	Vicepresidente de Negocios	30/08/2018	



Plan de Seguridad y Privacidad de la Información



SGSI

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Analizar los riesgos y definir de plan de tratamiento de Seguridad de la Información - 2 - GAI	El apoyo operativo de los diferentes procesos en conjunto con el oficial de seguridad de la información; identifican, evalúan, tratan y dan seguimiento a los riesgos de seguridad de la información a los que estén expuestos los activos de información con clasificación alta	Herramienta del SGSI NovaSec actualizada	Gerente de Inmuebles	30/08/2018	
Analizar los riesgos y definir de plan de tratamiento de Seguridad de la Información - 2 - SE	El apoyo operativo de los diferentes procesos en conjunto con el oficial de seguridad de la información; identifican, evalúan, tratan y dan seguimiento a los riesgos de seguridad de la información a los que estén expuestos los activos de información con clasificación alta	Herramienta del SGSI NovaSec actualizada	Vicepresidente de Negocios	30/08/2018	
Analizar los riesgos y definir de plan de tratamiento de Seguridad de la Información - 2 - SIU	El apoyo operativo de los diferentes procesos en conjunto con el oficial de seguridad de la información; identifican, evalúan, tratan y dan seguimiento a los riesgos de seguridad de la información a los que estén expuestos los activos de información con clasificación alta	Herramienta del SGSI NovaSec actualizada	Jefe de Servicio Integral al Usuario	30/08/2018	
Realizar la revisión por la dirección	Con el fin de asegurar la adecuación, convivencia y eficacia y alineación continua con el direccionamiento estratégico de CISA, al menos una vez al año se realiza revisión por la dirección con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Actas del Comité	Gerente de Planeación	30/09/2018	
Revisar las políticas y procedimientos del SGSI	Se realiza la revisión de políticas y procedimientos del Sistema de Seguridad de la Información logrando la mejora continua del mismo	Circular del SGSI actualizada	Gerente de Planeación	30/09/2018	



Plan de Seguridad y Privacidad de la Información



SGSI

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Reportar Indicadores - 3	Se realiza de forma trimestral y semestral la medición de los objetivos del sistema de seguridad de la información	Reporte en Isolucion actualizado	Gerente de Planeación	31/10/2018	
Realizar auditoria interna al sistema	Verificación del Sistema de Seguridad de la Información	Informe	Gerente de Planeación	31/10/2018	
Actualizar matriz de requisitos legales de seguridad de la información - 2	De forma semestral se valida la aplicabilidad de los requisitos legales de seguridad de la información y se define plan para dar cumplimiento.	Matriz de requisitos legales de seguridad de la información actualizada	Gerente de Planeación	30/12/2018	
Organizar el servidor de Archivos	Se realiza revisión de la información que se encuentra almacenada en el servidor de archivos y en los respectivos equipos de trabajo, logrando una unificación de la información y un orden de la misma	Servidor de Archivos organizado	Gerente de Planeación	31/12/2018	
Actualizar la declaración de aplicabilidad	Se actualiza declaración de aplicabilidad del sistema de seguridad de la información	Documento de Declaración de Aplicabilidad	Gerente de Planeación	31/12/2018	
Realizar seguimiento a acciones correctivas del sistema	Se realiza seguimiento a las oportunidades de mejora, no conformidades y acciones preventivas del sistema de seguridad de la información.	Reporte en Isolucion actualizado	Gerente de Planeación	31/12/2018	
Reportar Indicadores - 4	Se realiza de forma trimestral y semestral la medición de los objetivos del sistema de seguridad de la información	Reporte en Isolucion actualizado	Gerente de Planeación	31/01/2019	



Plan de Seguridad y Privacidad de la Información



Análisis de Vulnerabilidades

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Revisar acciones de mitigación	Se revisa que las acciones realizadas fueron efectivas	Informe	Gerente de Planeación	30/06/2018	
Definir prueba de ingeniería social	Se define alcance de prueba de ingeniería social y se realiza contratación	Orden de servicio gestionada	Gerente de Planeación	31/07/2018	
Definir plan de remediación de Re-test	Con la revisión del paso anterior se define plan de remediación para las vulnerabilidades que lo requieran	Plan de Remediación definido	Gerente de Planeación	30/08/2018	
Ejecutar prueba de Ingeniería Social	Se realizara ejecución de prueba de ingeniería social	Informe	Gerente de Planeación	30/08/2018	
Definir plan de remediación	Se define plan de remediación con respecto a las debilidades encontradas en la prueba de Ingeniería Social	Plan de remediación definido	Gerente de Planeación	30/10/2018	
Realizar seguimiento a planes de remediación	Se realiza seguimiento a los deferentes planes de remediación definidos para la mitigación de las vulnerabilidades técnicas identificadas	Informe de seguimiento al plan de remediación	Gerente de Planeación	30/11/2018	
Realizar seguimiento al plan de remediación ingeniería social	Se realiza seguimiento a plan de remediación definido para la mitigación de las vulnerabilidades humanas y técnicas identificadas.	Cuadro de seguimiento al plan de remediación	Gerente de Planeación	30/01/2019	



Plan de Seguridad y Privacidad de la Información



Seguimiento a Controles




Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar pruebas de Restauración	Se realizan pruebas de restauración a las copias de seguridad que se realizan y son entregadas al proveedor de archivo, para validar su integridad después de determinado tiempo.	Cuadro de Seguimiento al plan pruebas de restauración	Gerente de Planeación	31/12/2018	
Realizar seguimiento a controles técnicos del SGSI	Se realiza revisión de los controles técnicos del SGSI establecidos	Cuadro de Seguimiento al plan de seguimiento a los controles técnicos del SGSI	Gerente de Planeación	31/12/2018	
Revisar Desarrollo de Software	Se valida a través de buenas practicas de desarrollo seguro el código fuente de las aplicaciones desarrolladas por CISA	Cuadro de Seguimiento al plan de revisiones de desarrollo de software	Gerente de Planeación	31/12/2018	



Plan de Seguridad y Privacidad de la Información



Plan de Comunicación y Capacitación

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Definir el plan de comunicación, sensibilización y concientización	Se define plan de comunicación, sensibilización y concientización para los funcionarios de todos los niveles de la entidad	Plan de comunicación definido	Gerente de Planeación	31/07/2018	
Definir plan de capacitación SI	Se definen las diferentes capacitaciones de Seguridad de la Información	Plan de Capacitación definido	Gerente de Planeación	31/07/2018	
Ejecutar plan de capacitación	Ejecutar las actividades definidas en el marco del Plan de Capacitación de Seguridad de la Información	Cuadro de seguimiento plan de capacitación	Gerente de Planeación	30/07/2018	
Ejecución Plan de Comunicación, Sensibilización y Concientización	Se ejecuta plan de comunicaciones	Cuadro de seguimiento plan de comunicación	Gerente de Planeación	31/12/2018	



Plan de Seguridad y Privacidad de la Información



Ley Orgánica de Protección de Datos

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Actualizar base de datos en el RNBD (54 BD)	Se realiza actualización de base de datos en caso de cambios sustanciales de las mismas (aseguramiento, cantidad de titulares entre otros).	Reporte en el Software de la SIC	Gerente de Planeación	30/07/2018	
Reportar Incidentes de Seguridad de la Información - 1	Dando cumplimiento a la circular 002 de la superintendencia de industria y comercio se realiza de forma semestral el reporte de los incidentes de seguridad de la información que se presenten en las bases de datos	Reporte en el Software de la SIC	Gerente de Planeación	30/07/2018	
Reportar RNBD los reclamos realizados por los titulares - 1	Dando cumplimiento a la circular 002 de la superintendencia de industria y comercio se realiza de forma semestral el reporte de los reclamos realizados por los titulares	Reporte en el Software de la SIC	Gerente de Planeación	30/07/2018	
Realizar inscripción de las bases de datos que contengan datos personales	Se sensibiliza a los funcionarios con la creación de base de datos en caso de que se tenga reporte de base de datos que contenga datos personales se procede a hacer registro a la superintendencia de industria y comercio.	Reporte en el Software de la SIC	Gerente de Planeación	31/12/2018	
Reportar Incidentes de Seguridad de la Información - 2	Dando cumplimiento a la circular 002 de la superintendencia de industria y comercio se realiza de forma semestral el reporte de los incidentes de seguridad de la información que se presenten en las bases de datos	Reporte en el Software de la SIC	Gerente de Planeación	30/01/2019	
Reportar RNBD los reclamos realizados por los titulares - 2	Dando cumplimiento a la circular 002 de la superintendencia de industria y comercio se realiza de forma semestral el reporte de los reclamos realizados por los titulares	Reporte en el Software de la SIC	Gerente de Planeación	30/01/2019	



Plan Estratégico de Tecnologías de la Información



Identificar, evaluar, tratar y dar seguimiento a los riesgos de seguridad de la información a los que estén expuestos los activos de información con clasificación alta en cualquiera de los pilares de Seguridad de la Información (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad).

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Formular PETI 2019-2022	Al culminar el análisis de brecha del nivel de implementación del modelo IT4+ (Arquitectura TI), los componentes del direccionamiento estratégico TI para CISA (Propuesta de valor y objetivos estratégicos) y el cuadro de mando integral basado en Balance ScoreCard como base del despliegue, operación, medición y mejora de la gestión de TIC en CISA, actividades planeadas para culminar en octubre de 2018, entregar a la entidad un PETI 2019-2022 que aporte a la transformación de CISA y al cambio organizacional.	Plan Estratégico de Tecnología 2019-2022	Director de Tecnología	31/10/2018	
Potenciar la capacidad tecnológica de CISA	Potenciar la capacidad tecnológica de CISA a través de acuerdos, contratos marco u otras figuras que le permitan activar por demanda las manos necesarias para evacuar en el tiempo requerido los proyectos tácticos y estratégicos que garanticen la agilidad de los procesos de negocio, el ejercicio comercial y la generación de ingreso desde cualquiera de los frentes de negocio.	Contrato marco de servicios de base tecnológica para apoyo al desarrollo de proyectos de la línea de Software Estado.	Director de Tecnología	30/11/2018	



Gracias
